

Руководитель
регионального проекта
Ким Илья Аркадьевич

(подпись)

13.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

"(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

2. Информация о значениях показателей по субъектам Российской Федерации

№ п/п	Статус	Наименование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец текущего года	Процент достижения значения показателя	Комментарий
					I	II	III	IV			
Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения											
Уральский федеральный округ											
1		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	процент	85,9	85,9	85,9	85,9	87,26	85,9	100%	Предварительная информация Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
		Основной. Доля населения ХМАО-Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %									
Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения											
Уральский федеральный округ											
2		Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	процент	87,3	87,3	87,3	87,3	86,48	87,3	99,06%	Предварительная информация Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре
		Основной. Доля городского населения ХМАО-Югры, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, %									



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических




Сведения не представлены




Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года
Всего: 65 184,20 тыс. руб

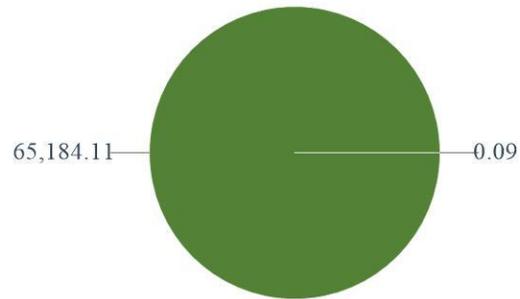

Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года
Всего: 67 277,00 тыс. руб

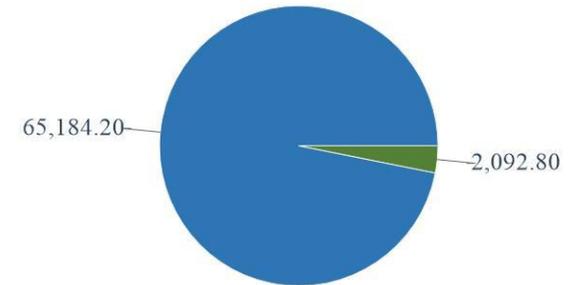

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено

 Риски исполнения

 Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(05) Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	67 277,00	67 277,00	67 277,00	0,00	67 276,91	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	67 277,00	67 277,00	67 277,00	0,00	67 276,91	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	65 184,20	65 184,20	65 184,20	0,00	65 184,11	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	65 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	67 277,00	2 092,80	2 092,80	0,00	2 092,80	100,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			67 277,00	67 277,00	67 277,00	0,00	67 276,91	100,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			67 277,00	67 277,00	67 277,00	0,00	67 276,91	100,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			65 184,20	65 184,20	65 184,20	0,00	65 184,11	100,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			65 184,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			67 277,00	2 092,80	2 092,80	0,00	2 092,80	100,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Проведена оценка состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения. Значение: 1, на дату 01.08.2019	01.08.2019	30.04.2019	Малхосян Г. В.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оценка состояния объектов систем водоснабжения" Итоговый отчет Губернатор ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01-исх-НК-Г-9528, приложен файл. Информация по результату: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Оценка состояния объектов систем водоснабжения ХМАО-Югры" Итоговый отчет Губернатор ХМАО-Югры от 30.04.2019г. №01-исх-НК-Г-9528, приложен файл.
1.1	РПП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	01.02.2019	13.02.2019	Малхосян Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо в МО о начале инвентаризации" Депжкк и энергетики Югры от 13.02.2019г. №630, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РПП		Направление официального письма в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о проведении оценки состояния объектов централизованных систем водоснабжения и водоподготовки на предмет соответствия установленным показателям качества и безопасности питьевого водоснабжения (инвентаризации)	01.02.2019	13.02.2019	Малхосян Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "письмо о начале инвентаризации" Депжкк и энергетики Югры от 13.02.2019г. №630, приложен файл.
1.2	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	01.05.2019	30.04.2019	Малхосян Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о завершении инвентаризации от муниципальных образований" Департамент ЖКК и энергетики Югры от 19.04.2019г. №937, приложен файл. 2. "Сопроводительное письмо и отчет об инвентаризации в Фонд ЖКХ" Губернатор ХМАО от 30.04.2019г. №01-исх-НК-Г-9528, приложен файл.
1.2.1	РПП		Муниципальными образованиями автономного округа проведена инвентаризация объектов водоснабжения, в соответствии с методическими рекомендациями, отчеты представлены в Депжкк и энергетики Югры	15.04.2019	19.04.2019	Малхосян Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информация о выполнении инвентаризации МО" Департамент жкк и энергетики Югры от 19.04.2019г. №937, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.2.2	РПП		Подготовлен и представлен в Фонд ЖКХ сводный отчет об инвентаризации объектов водоснабжения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре	01.05.2019	30.04.2019	Малхосян Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет и письмо о направлении отчета по инвентаризации в Фонд" Губернатор ХМАО от 30.04.2019г. №01-исх-НК-Г-9528, приложен файл.
2			Утверждена региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, с учетом оценки качества и безопасности питьевой воды, а также оценки эффективности модернизации систем водоснабжения и водоподготовки, относимых к категориям чрезвычайно высокого и высокого риска причинения вреда здоровью потребителей по критериям безопасности (далее - региональная программа повышения качества водоснабжения) Значение: 1, на дату 01.10.2019	01.10.2019	26.07.2019	Сулима М. Н.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О программе ХМАО-Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год" Постановление Правительства ХМАО-Югры Правительство ХМАО-Югры от 26.07.2019г. №239-п, приложен файл. Информация по результату: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О программе ХМАО-Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год" Постановление Правительства ХМАО-Югры Правительство ХМАО-Югры от 26.07.2019г. №239-п, приложен файл.
2.1	РПП		Проведено исследование по вопросу формирования и (или) тематике документа	01.06.2019	27.05.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол общественных слушаний" Департамент жккк и энергетики Югры от 27.05.2019г. №5, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РПП		Проведены общественные слушания по подготовке региональной программы на период с 2019 по 2024 год	01.06.2019	27.05.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Протокол общественных слушаний" Протокол Департамент жкк и энергетики Югры от 27.05.2019г. №5, приложен файл.
2.2	РПП		Документ разработан	01.08.2019	15.07.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "проект Постановления ХМАО-Югры по повышению качества питьевого водоснабжения на период с 2019 по 2024 год" Департамент жилищно-коммунального комплекса и энергетики ХМАО-Югры от 15.07.2019г. №б/н, приложен файл.
2.2.1	РПП		Подготовлен проект региональной программы по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год	01.08.2019	15.07.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проект Постановления Правительства ХМАО-Югры по региональной программе" Проект Региональной программы от 15.07.2019г. №без номера, приложен файл.
2.3	РПП		Документ согласован с заинтересованными органами и организациями	01.08.2019	19.07.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Согласование проекта Постановления по региональной программе Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре " Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 19.07.2019г. №01-04/4525, приложен файл.
2.3.1	РПП		Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре согласована региональная программа по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год	01.08.2019	19.07.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Согласование проекта Постановления по региональной программе Управлением Роспотребнадзора по ХМАО-Югре" Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 19.07.2019г. №01-04/4525, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.4	РПП		Документ утвержден (подписан)	01.08.2019	26.07.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства ХМАО-Югры о программе ХМАО-Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год" Правительство ХМАО-Югры от 26.07.2019г. №239-п, <u>приложен файл.</u>
2.4.1	РПП		Утверждена региональная программа Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год и направлена в Минстрой России	01.08.2019	26.07.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Постановление Правительства ХМАО-Югры о программе ХМАО-Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019-2024 год" Правительство ХМАО-Югры от 26.07.2019г. №239-п, <u>приложен файл.</u>
3			Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	30.12.2024	Сулима М. Н.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
3.1	РПП		В Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры направлен отчет Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре о повышении доли населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой в 2019 году	31.12.2019	30.12.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре" Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 30.12.2019г. №02-04/9116, <u>приложен файл.</u>

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РПП		Направление отчета Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре о повышении доли населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой	31.12.2019	30.12.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре" Управление Роспотребнадзора по ХМАО-Югре от 30.12.2019г. №02-04/9116, приложен файл.
4			Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 4, на дату 31.12.2024	31.12.2024	30.12.2024	Сулима М. Н.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
4.1	РПП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	30.03.2019	22.03.2019	Морозов А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение о проверке сметной стоимости реконструкции" АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" от 22.03.2019г. №86-1-0164-19 приложен файл.
4.1.1	РПП		Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту "Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях"	30.03.2019	22.03.2019	Морозов А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение о проверке сметной стоимости реконструкции" АУ "Управление государственной экспертизы проектной документации" от 22.03.2019г. №86-1-0164-19, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.2	РПП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	31.08.2019	26.03.2019	Морозов А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на строительство" Разрешение на строительство МКУ Администрация г. Пыть-Ях от 26.03.2019г. №86-гу86308000-12-2019, указана ссылка.
4.2.1	РПП		Получение разрешения на строительство (реконструкцию) по объекту: "Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях"	31.08.2019	26.03.2019	Морозов А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "разрешение на строительство" Разрешение на строительство МКУ Администрация г. Пыть-Ях от 25.03.2019г. №86-гу86308000-12-2019, указана ссылка.
4.3	РПП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	30.06.2024	26.09.2013	Ямашев И. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "положительное заключение государственной экспертизы" БУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" от 23.04.2013г. №86-1-3-0132-13, приложен файл. от 26.09.2013г. №86-1-6-0198-13 приложен файл.
4.3.1	РПП		Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Питьевое водоснабжение г. Нягань (Корректировка РП и технологической схемы станции очистки воды) Полное развитие (2 этап)"	30.09.2013	26.09.2013	Ямашев И. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Положительное заключение экспертизы" АУ ХМАО-Югры "Управление государственной экспертизы проектной документации и ценообразования в строительстве" от 26.09.2013г. №86-1-6-0198-13, приложен файл.
4.4	РПП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	15.02.2019	12.02.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-" Соглашение МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО от 12.02.2019г. №069-09-2019-302, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4.4.1	РПП		Заключение соглашения с Минстроем России о финансовой поддержке из федерального бюджета	15.02.2019	12.02.2019	Сулима М. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-" Соглашение МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО от 12.02.2019г. №069-09-2019-302, <u>приложен файл.</u>
4.5	РПП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	01.10.2019	08.10.2019	Сулейманов Т. Г.	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного" Соглашение Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 08.10.2019г. №71885000-1-2019-006, <u>приложен файл.</u>
4.5.1	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении в 2019 году финансовой поддержки	01.10.2019	08.10.2019	Сулейманов Т. Г.	Выполнено. Просрочка 7 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного" Соглашение Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 08.10.2019г. №71885000-1-2019-006, <u>приложен файл.</u>
4.6	РПП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	27.12.2019	Сулейманов Т. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о выполнении условий соглашения" Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 27.12.2019г. №33-исх-7018, <u>приложен файл.</u>
4.6.1	РПП		Муниципальными образованиями автономного округа реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой в 2019 году (АИП)	31.12.2019	27.12.2019	Сулейманов Т. Г.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о выполнении условий соглашения" Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры от 27.12.2019г. №33-исх-7018, <u>приложен файл.</u>

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

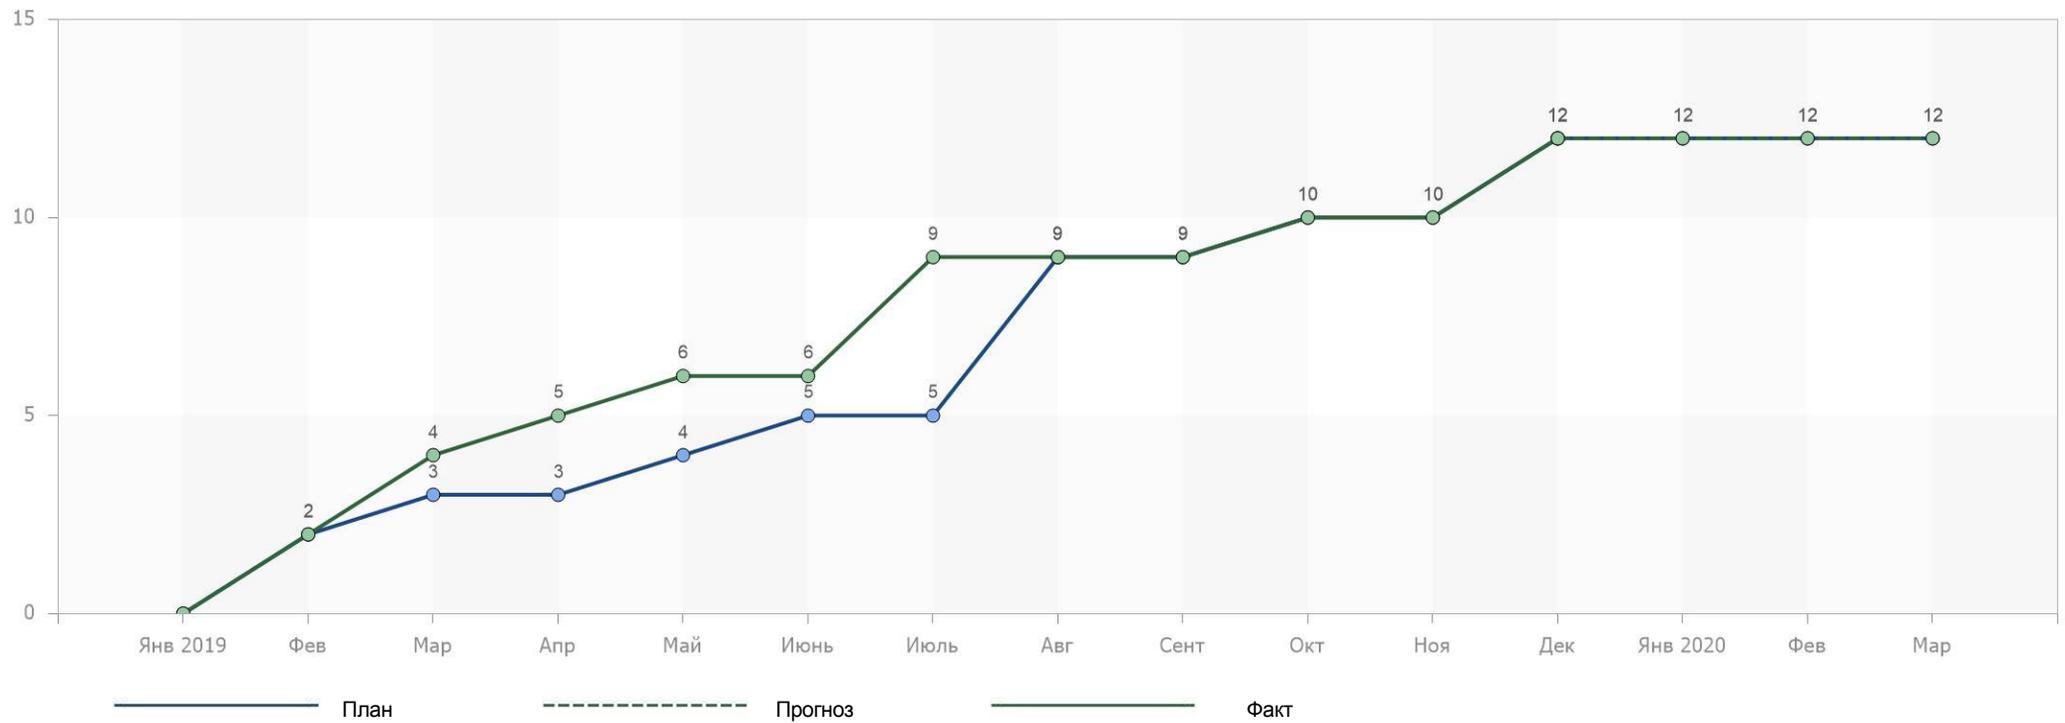


Рис. 1. "(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения
