

Руководитель
регионального проекта —
Ким Илья Аркадиевич

(подпись)






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА

"(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"



Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	87.26	75.09	75.09	75.09	86	86	87,31%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на 01.01.2020" Отчет Департамент ЖКК и энергетики ХМАО от 23.03.2020г. №бн, приложен файл.
2		Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	Процент	86.48	76.85	76.85	76.85	87.3	87.3	88,03%	Подтверждающие документы: 1. "Отчет об инвентаризации объектов водоснабжения на 01.01.2020" Отчет Департамент ЖКК и энергетики ХМАО от 23.03.2020г. №бн, приложен файл.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 30 сентября 2020 года
Всего: 418 634,30 тыс. руб

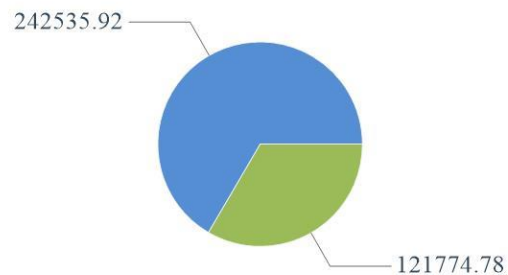


Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Сводный бюджет МО
на 30 сентября 2020 года
Всего: 438 441,20 тыс. руб

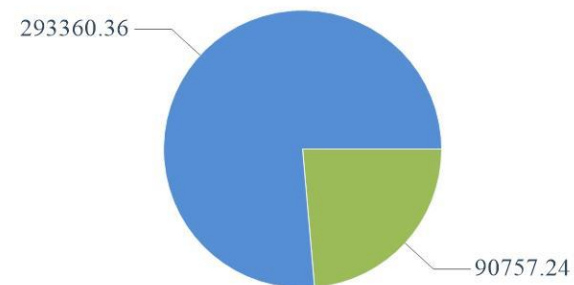

Внебюджетные источники
на 30 сентября 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

 Фактически исполнено

 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.


Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета)	278 661,00	278 661,00	278 661,00	266 067,60	31 966,29	11,47	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	278 661,00	278 661,00	278 661,00	266 067,60	31 966,29	11,47	внесено
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	266 067,60	266 067,60	266 067,60	266 067,60	31 966,29	12,01	внесено
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	266 067,60	266 067,60	266 067,60	266 067,60	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	278 661,00	278 661,00	278 661,00	266 067,60	0,00	0,00	внесено
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		<i>(05) Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения</i>	159 780,20	159 780,20	159 780,20	0,00	90 757,24	56,80	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	159 780,20	159 780,20	159 780,20	0,00	90 757,24	56,80	внесено
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	152 566,70	152 566,70	152 566,70	0,00	89 808,49	58,87	внесено
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	152 566,70	152 566,70	152 566,70	0,00	89 808,49	58,87	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	159 780,20	159 780,20	159 780,20	0,00	90 757,24	56,80	внесено
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			438 441,20	438 441,20	438 441,20	266 067,60	122 723,53	27,99	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			438 441,20	438 441,20	438 441,20	266 067,60	122 723,53	27,99	
бюджет субъекта Российской Федерации			418 634,30	418 634,30	418 634,30	266 067,60	121 774,78	29,09	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			418 634,30	418 634,30	418 634,30	266 067,60	89 808,49	21,45	
бюджеты муниципальных образований			438 441,20	438 441,20	438 441,20	266 067,60	90 757,24	20,70	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений











 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2020	
2		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета) Значение: 2,0000 Дата: 31.12.2022	
3		Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	
4		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2020	
5		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2021	
6		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 3,0000 Дата: 31.12.2022	


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
7		Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2023	 1

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений






Сведения не
представлены













Прогнозные
сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета) Значение: 2, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Сулейманов Т. Г.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 2 из 2.
1.1.	РРП		Получено разрешение на строительство (реконструкцию)	31.08.2020	27.05.2020	Зверев К. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство (реконструкцию)" Разрешение на строительство МКУ "Администрация города Пыть-Яха" от 27.05.2020г. №86-ru86308000-8-2020, приложен файл. отклонения отсутствуют
1.1.1	РРП		Получение разрешения на строительство (реконструкцию) объекта: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях	31.08.2020	27.05.2020	Морозов А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Разрешение на строительство (реконструкцию)" Разрешение на строительство МКУ "Администрация города Пыть-Яха" от 27.05.2020г. №86-ru86308000-8-2020, приложен файл.


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							
1.2.	РРП		Строительно-монтажные работы завершены	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.2.1	РРП		Завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
1.2.2	РРП		Завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор".	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.3.	РРП		Оборудование приобретено	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.3.1	РРП		Приобретение оборудования по объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
1.3.2	РРП		Приобретение оборудования по объекту: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.4.	РРП		Оборудование установлено	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.4.1	РРП		Установка оборудования по объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
1.4.2	РРП		Установка оборудования по объекту:	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.










 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений









 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены







 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			"Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор"				
1.5.	РРП		Оборудование введено в эксплуатацию	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.5.1	РРП		Ввод в эксплуатацию оборудования по объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
1.5.2	РРП		Ввод в эксплуатацию оборудования по объекту: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.6.	РРП		Техническая готовность объекта, %	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.6.1	РРП		Техническая готовность объекта: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях" 100%	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
1.6.2	РРП		Техническая готовность объекта: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор" 100%	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.7.	РРП		Заключение органа государственного строительного надзора получено	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.7.1	РРП		Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора автономного округа по	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.







³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			объекту: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях"				
1.7.2	РРП		Получение заключения Службы жилищного и строительного надзора автономного округа по объекту: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.8.	РРП		Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.8.1	РРП		Ввод в эксплуатацию объекта: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.8.2	РРП		Ввод в эксплуатацию объекта: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания №1 гп. Лянтор"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.
1.9.	РРП		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.9.1	РРП		Оформление государственной регистрации права на объект: "Реконструкция ВОС-1 (2 очередь) г. Пыть-Ях"	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
1.9.2	РРП		Оформление государственной регистрации права на объект: "Водозаборные очистные сооружения №1. Водоочистная станция 16,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.







³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			обезжелезивания №1 гп. Лянтор"				
1.10.	РРП		Утверждено распределение межбюджетных трансфертов по субъектам Российской Федерации (муниципальным образованиям)	30.09.2020	16.03.2020	Зверев К. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры" Департамент ЖKK и энергетики ХМАО-Югры от 16.03.2020г. №14-ЧВ-2020, приложен файл.
1.10.1	РРП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении в 2020 году финансовой поддержки (Пыть-Ях)	30.09.2020	16.03.2020	Зверев К. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" Соглашение Департамент ЖKK и энергетики ХМАО-Югры от 16.03.2020г. №14-ЧВ-2020, приложен файл.
1.10.2	РРП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении в 2020 году финансовой поддержки (Лянтор)	30.09.2020	03.03.2020	Зверев К. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета ХМАО-Югры" Соглашение Департамент ЖKK и энергетики ХМАО-Югры от 03.03.2020г. №21-ЧВ-2020, приложен файл.
1.11.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
1.11.1	РРП		Муниципальными образованиями автономного округа реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(АИП)				
2.			Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения (за счет средств окружного бюджета) Значение: 2, на дату 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2020	Сулейманов Т. Г.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 2 из 2.
2.1.	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
2.1.1	РРП		Получение положительного заключения по объекту: "Реконструкция водозаборных и водоочистных сооружений в гп. Приобье"	31.12.2020	31.12.2020	Куташова А. П.	В работе.
3.			Обеспечено качественной питьевой водой 95,5% городского населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Значение: 1, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Сулима М. Н.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
3.1.	РРП		В Департамент ЖКК и энергетики ХМАО-Югры направлен отчет Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре о повышении доли населения автономного округа,	31.12.2020	31.12.2020	Сулима М. Н.	В работе. отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			обеспеченного качественной питьевой водой в 2020 году				
3.1.1	РРП		Направление отчета Управления Роспотребнадзора по ХМАО-Югре о повышении доли населения автономного округа, обеспеченного качественной питьевой водой	31.12.2020	31.12.2020	Сулима М. Н.	В работе.
4.			<i>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 0, на дату 31.12.2020</i>	31.12.2020	31.12.2020	Сулейманов Т. Г.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
4.1.	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
4.1.1	РРП		Муниципальными образованиями автономного округа реализованы мероприятия, предусмотренные региональной программой повышения качества водоснабжения в 2020 году (АИП)	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе.
5.			<i>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого</i>	31.12.2021	31.12.2021	Сулейманов Т. Г.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений









Наличие критических отклонений








Сведения не представлены






Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 1, на дату 31.12.2021</i>				Предоставлена информация : 1 из 1.
5.1.	РРП		Строительно-монтажные работы завершены	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе. отклонения отсутствуют
5.1.1	РРП		Монтаж главного корпуса ВОС-3 г. Пыть-Ях	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
5.1.2	РРП		Завершение строительно-монтажных работ по объекту: "Реконструкция ВОС-3 г. Пыть-Ях"	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
5.1.3	РРП		Размещение паспортов объектов или информационных стендов (баннеров) на строительной площадке с применением компонентов единого визуального стиля (логотип национального проекта "Экология")	31.12.2020	31.12.2020	Морозов А. Н.	В работе.
6.			<i>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского</i>	31.12.2022	31.12.2022	Сулейманов Т. Г.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 3 из 3.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			<i>автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 3, на дату 31.12.2022</i>				
6.1.	РРП		Получены положительные заключения по результатам государственных экспертиз	31.12.2020	31.12.2020	Зверев К. В.	В работе. отклонения отсутствуют
6.1.1	РРП		Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Объект водоснабжения для повышения качества питьевой воды в городе Нефтеюганске"	31.12.2020	31.12.2020	Дегтярев С. Ю.	В работе.
6.1.2	РРП		Получение положительного заключения государственной экспертизы по объекту: "Реконструкция водоочистных сооружений в гп.Пойковский Нефтеюганского района"	30.11.2020	30.11.2020	Лапковская Г. В.	В работе.
7.			<i>Реализованы мероприятия по строительству и реконструкции (модернизации) объектов питьевого водоснабжения, предусмотренные региональной программой, достигнуто повышение доли населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (в том числе городского), обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения Значение: 4, на дату</i>	31.12.2023	31.12.2023	Сулейманов Т. Г.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 4 из 4.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

№ п/п	Уровень контроля ³	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			31.12.2023				
7.1.	РРП		Земельный участок предоставлен заказчику	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе. отклонения отсутствуют
7.1.1	РРП		Получение земельного участка под объект: "Водозаборные очистные сооружения 16,0 тыс. м3/сут. Водоочистная станция 8,0 тыс. м3/сут. Реконструкция станции обезжелезивания"	31.12.2020	31.12.2020	Трубецкой А. А.	В работе.

³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Динамика достижения контрольных точек

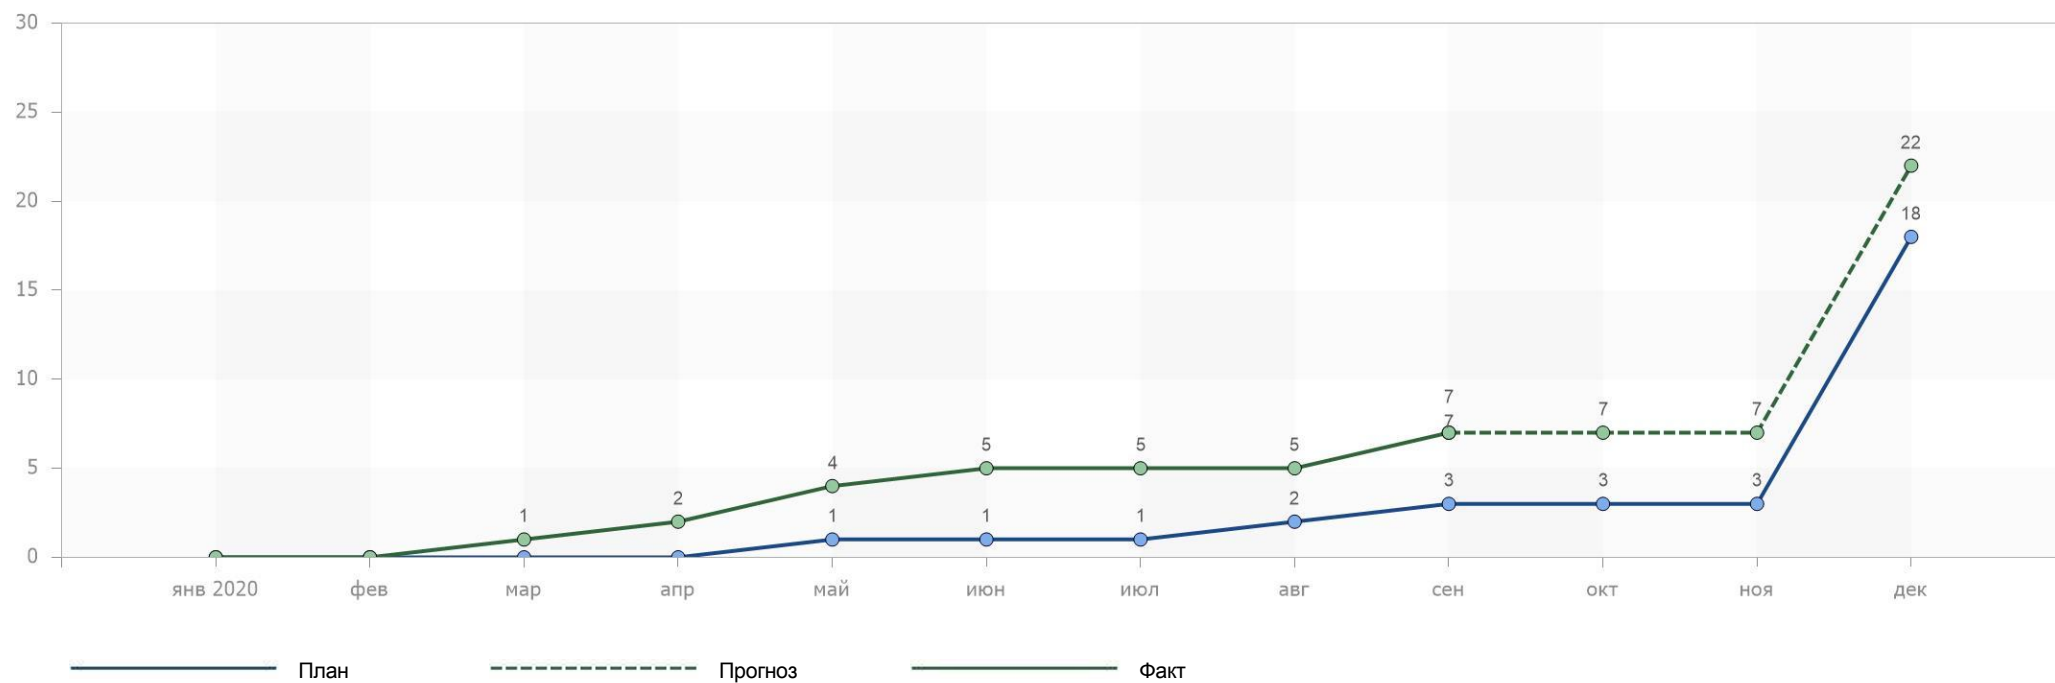


Рис. 1. "(G5-71) Чистая вода (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

График достижения показателя

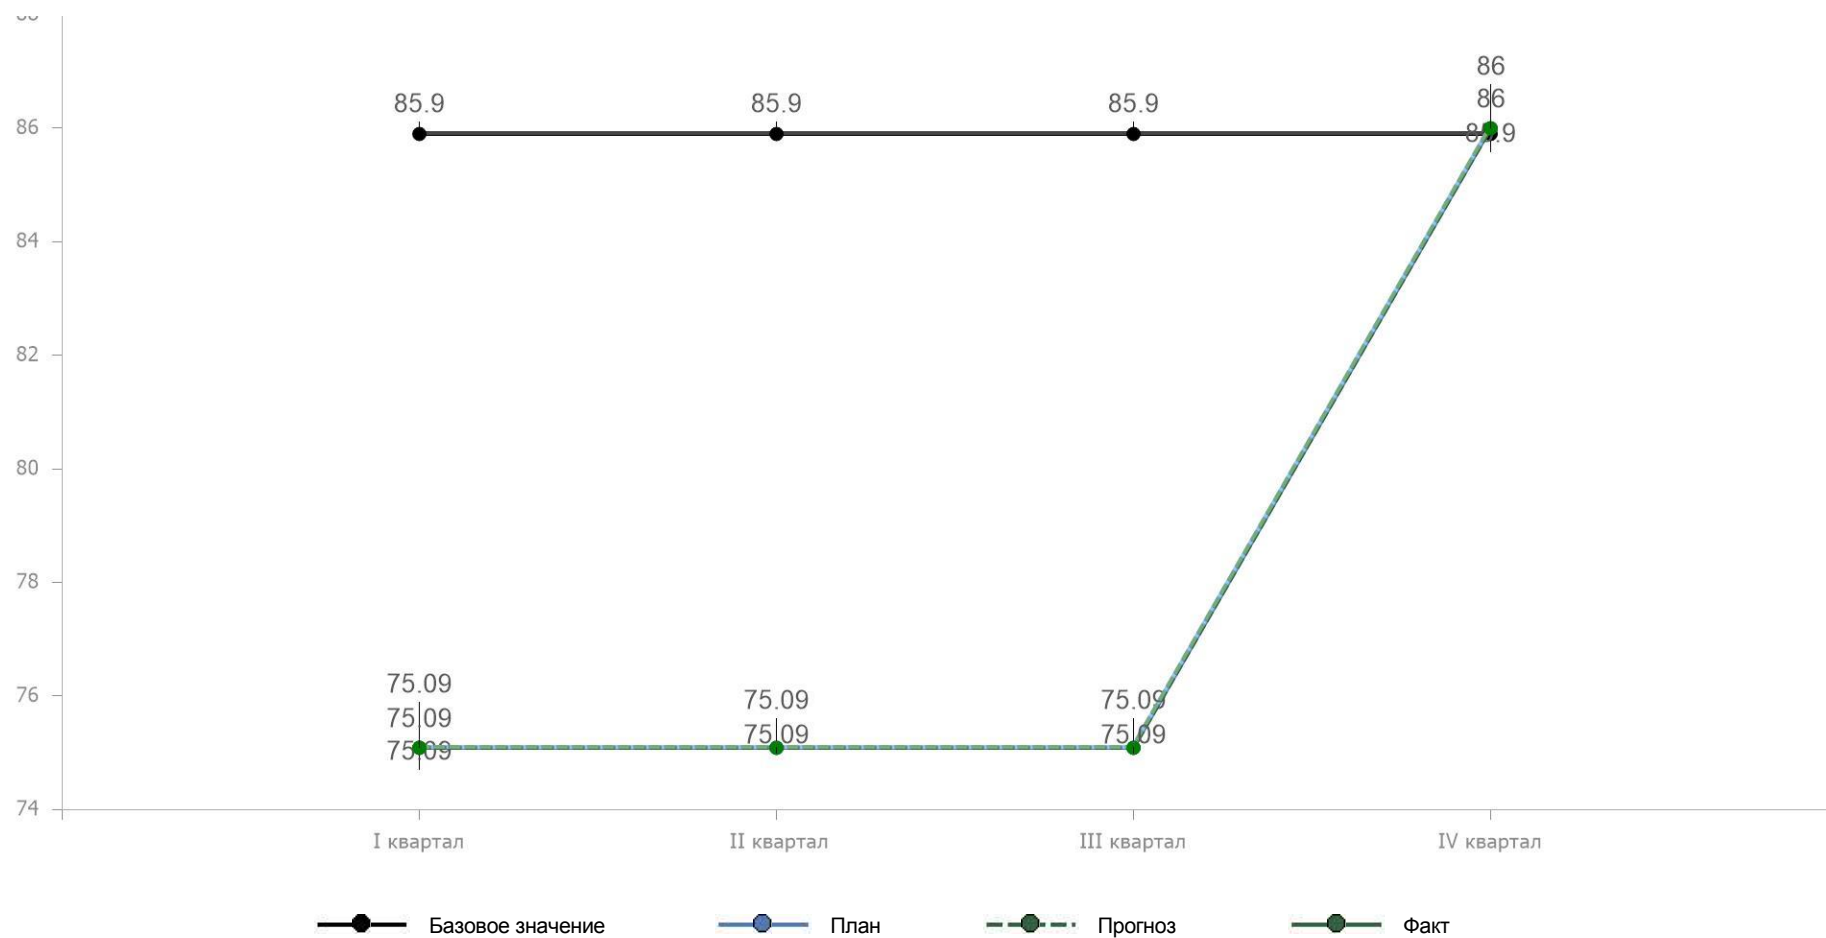


Рис. 1. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Диаграмма достижения показателя

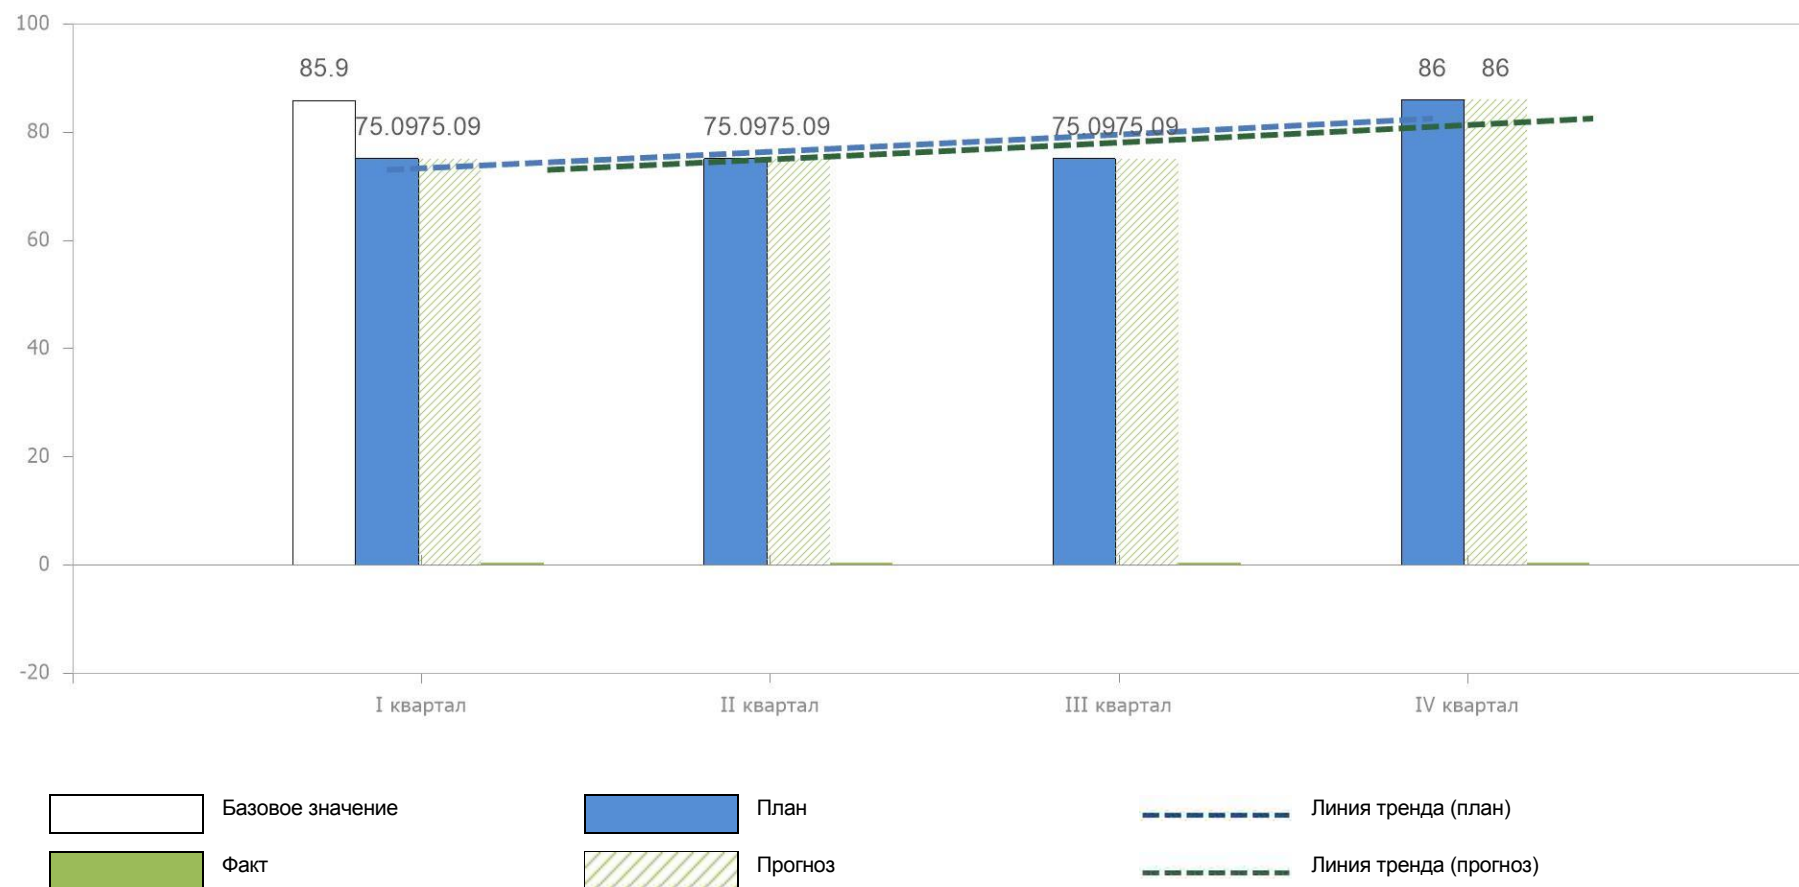


Рис. 2. Доля населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

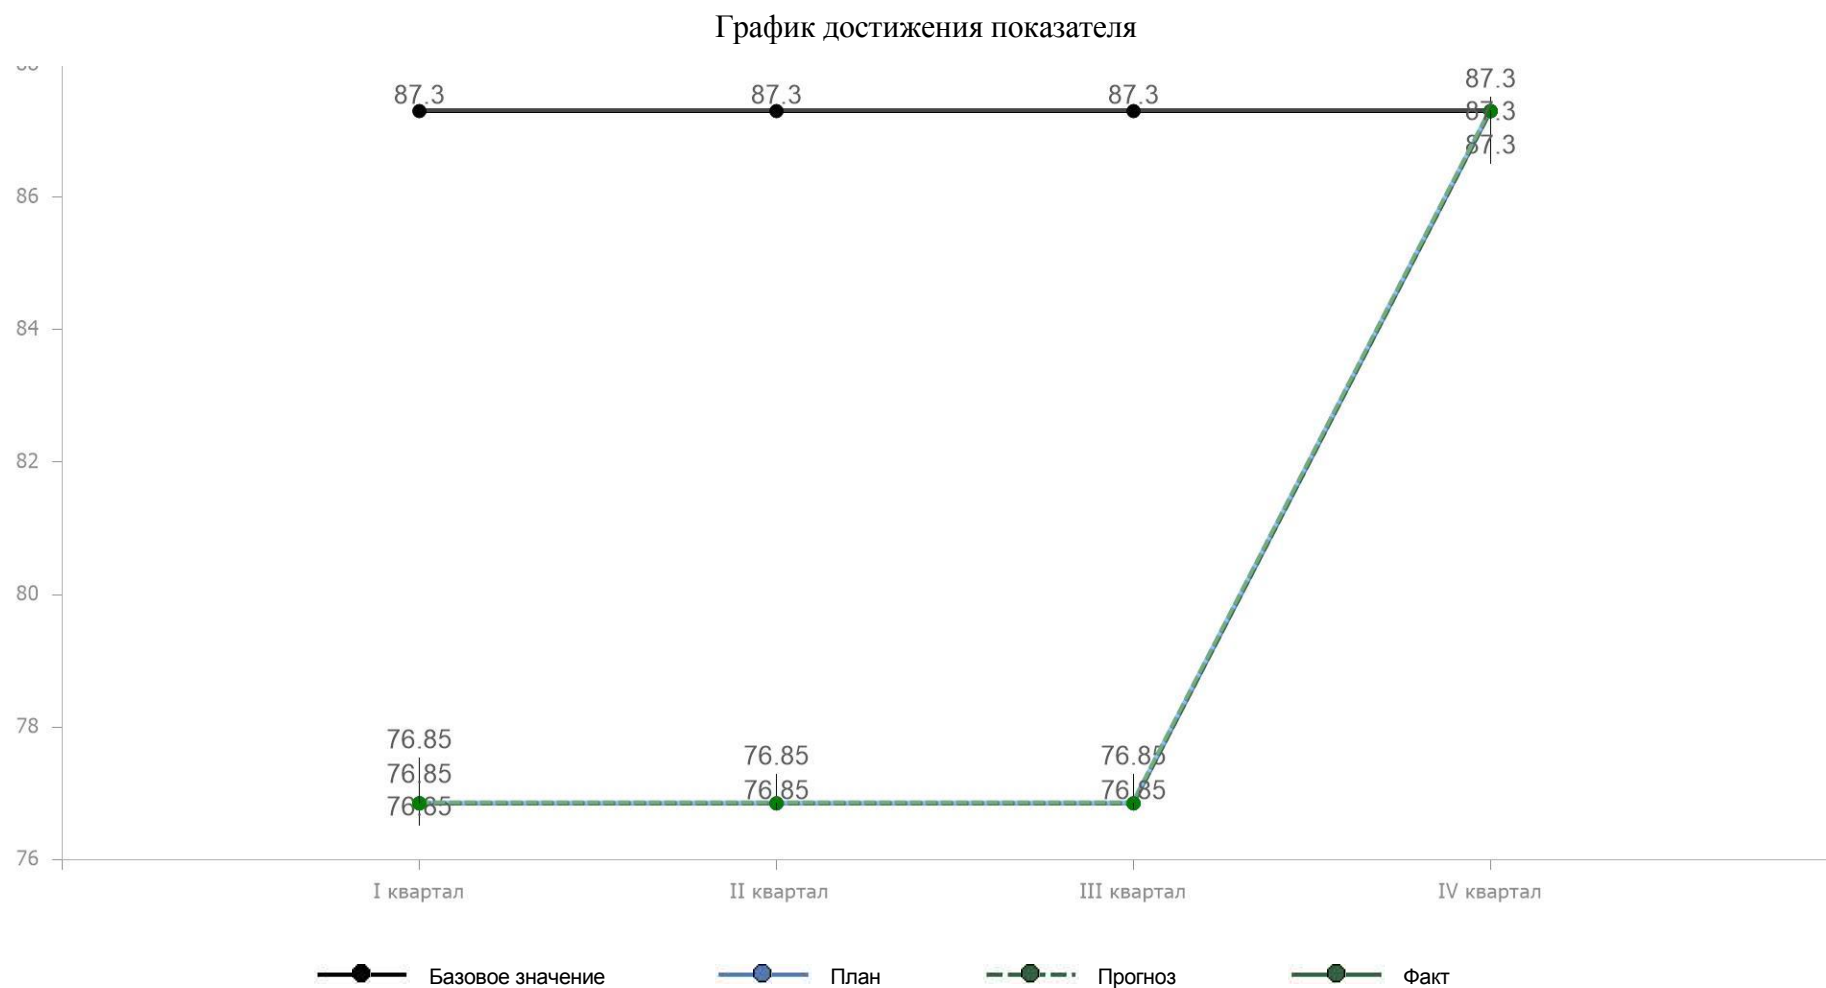


Рис. 3. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения

Диаграмма достижения показателя

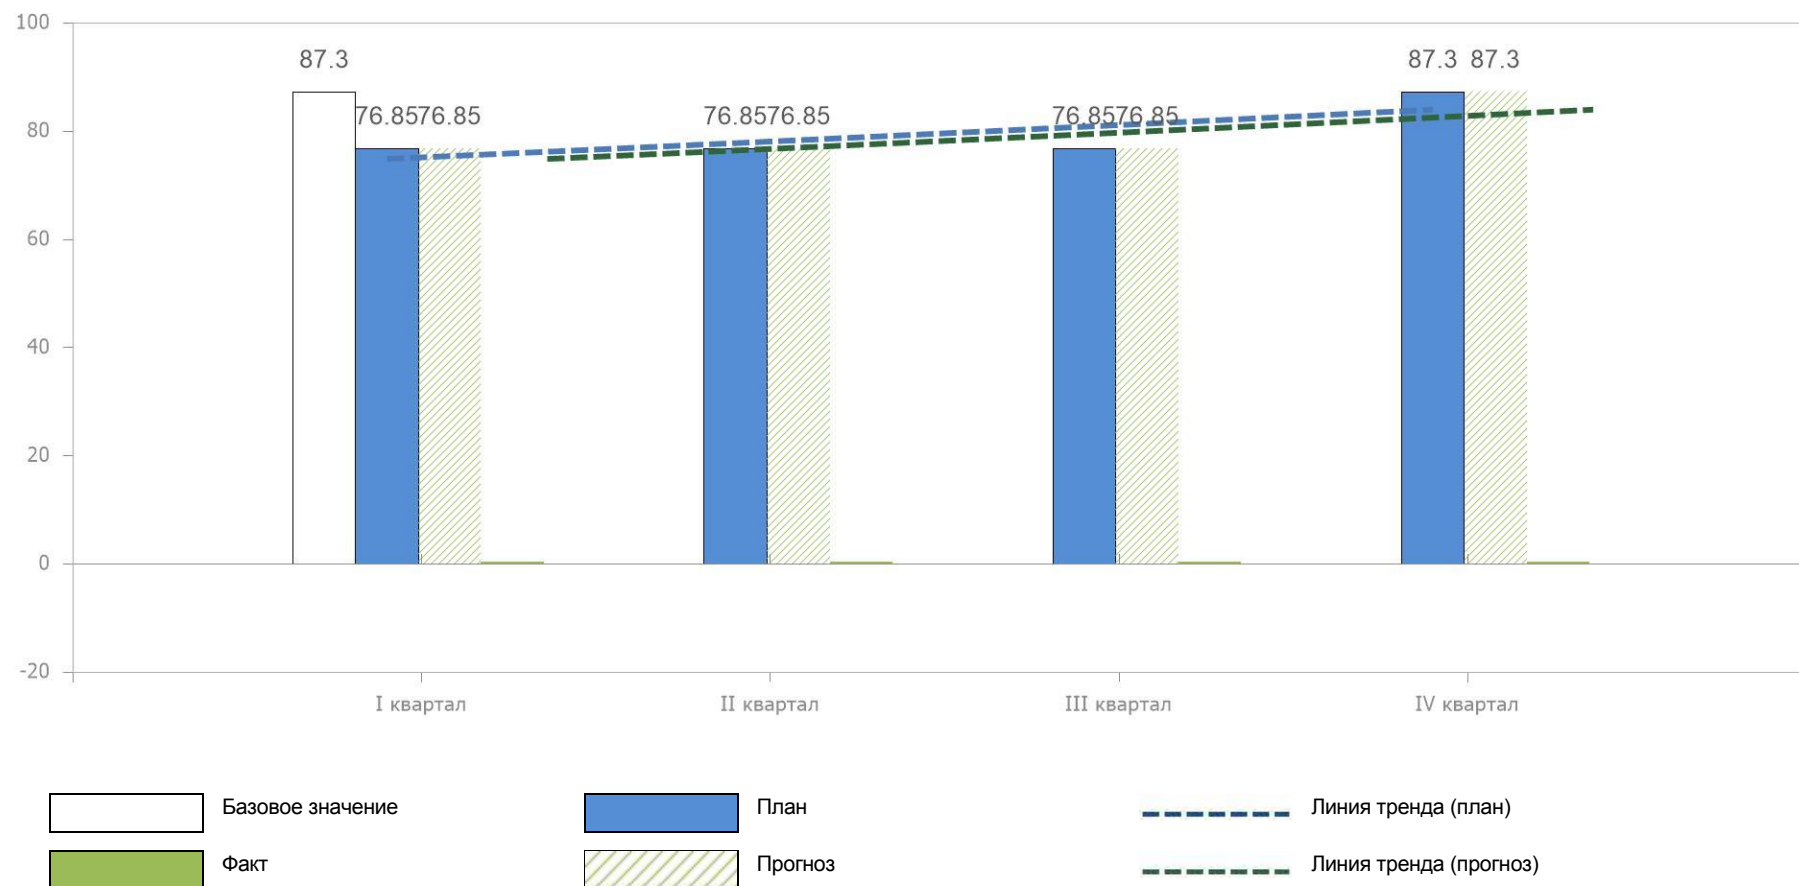


Рис. 4. Доля городского населения Российской Федерации, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения
