

Руководитель
регионального проекта —
Ким Илья Аркадиевич

(подпись)
12.05.2020






ОДОБРЕН

ОТЧЕТ

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

"(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 30 апреля 2020 года

Всего: 997 935,43 тыс. руб




Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года

Всего: 215 730,58 тыс. руб



Внебюджетные источники
на 30 апреля 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01) Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2019 № 335-п	664 712,88	664 712,88	664 712,88	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	664 712,88	664 712,88	664 712,88	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	531 770,30	531 770,30	531 770,30	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	132 942,58	132 942,58	132 942,58	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(04) Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской	55 886,80	55 886,80	55 886,80	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		среды в малых городах и исторических поселениях.							
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	55 886,80	55 886,80	55 886,80	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	55 886,80	55 886,80	55 886,80	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	55 886,80	55 886,80	55 886,80	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	55 886,80	55 886,80	55 886,80	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(10) Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	548 953,13	548 953,13	548 953,20	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений




Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	548 953,13	548 953,13	548 953,20	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	466 165,13	466 165,13	466 165,20	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	466 165,13	466 165,13	466 165,13	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	548 953,13	548 953,13	548 953,20	0,00	0,00	0,00	Оплата не осуществлялась
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 269 552,80	1 269 552,88	1 269 552,88	0,00	0,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 269 552,80	1 269 552,88	1 269 552,88	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 053 822,23	1 053 822,30	1 053 822,30	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			522 051,93	522 051,93	522 051,93	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
бюджеты муниципальных образований			737 782,51	737 782,51	737 782,51	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений









Сведения не
представлены




Прогнозные
сведения


4. Статус достижения результатов


№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2019 № 335-п	
2		Реализованы проекты победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.	
3		Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения (городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды	


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений





 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения






5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Реализованы мероприятия по благоустройству территорий муниципальных образований, утвержденных в Постановлении по строке 9.2. государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.09.2019 № 335-п Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Ким И. А.	Информация по значению результата: В работе.Риски незавершения отсутствуют Предоставлена информация : 1 из 1.
1.1	РНП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ в 2020 году	15.05.2020	09.12.2019	Эрнст С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от 05.08.2019г. №178/ЭА, приложен файл. 2. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от 28.10.2019г. №243/ЭА, приложен файл. 3. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от 09.12.2019г. №310-ЭА, приложен файл. Указанный показатель будет достигнут полностью
1.1.1	РРП		Заключение контрактов на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ в 2020 году	15.05.2020	09.12.2019	Ряшин М. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от 05.08.2019г. №178/ЭА, приложен файл. 2. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от 28.10.2019г. №243/ЭА, приложен файл. 3. "Муниципальный контракт" Муниципальный контракт от 09.12.2019г. №310-ЭА, приложен файл. Указанный показатель будет достигнут полностью
2			Реализованы проекты победителей Всероссийского	31.12.2020	31.12.2020	Маненков С. П.	В работе.Риски неисполнения отсутствуют Предоставлена





ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
		 	конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Значение: 1, на дату 31.12.2020				информация : 1 из 1.
2.1	РНП		Заключен контракт на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2020	30.12.2019	Эрнст С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт от 26.08.2019г. №01873000085190001400001" Муниципальный контракт от 26.08.2019г. №01873000085190001400001, приложен файл. 2. "Муниципальный контракт от 30.12.2019г. №01873000085190002010001" Муниципальный контракт от 30.12.2019г. №01873000085190002010001, приложен файл. Риски неисполнения отсутствуют
2.1.1	РПП		Заключение контракта на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации проекта победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях	15.03.2020	30.12.2019	Маненков С. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт № 01873000085190001400001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района " Контракт от 26.08.2019г. №01873000085190001400001, приложен файл. 2. "Муниципальный контракт № 01873000085190002010001 на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района" Контракт от 30.12.2019г. №01873000085190002010001, приложен файл. Риски неисполнения отсутствуют
3			Реализованы мероприятия по благоустройству мест массового отдыха населения	31.12.2020	30.12.2020	Ким И. А.	Информация по значению результата: В работе.Риск неисполнения отсутствует Предоставлена информация : 124 из 124.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(городских парков), общественных территорий (набережные, центральные площади, парки и др.) муниципальных образований, предусмотренные государственными (муниципальными) программами формирования современной городской среды Значение: 124, на дату 31.12.2020				
3.1	РНП		Заключено соглашение с Министром России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.02.2020	18.12.2019	Эрнст С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бю джета бюджету ХантыМансийского автономного округа - Юг ры на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципа льных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»" Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020-079, приложен
3.1.1	РПП		Заключение соглашения с Министром России о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету автономного округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.02.2020	18.12.2019	Эрнст С. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бю джета бюджету ХантыМансийского автономного округа - Юг ры на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципа льных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» " Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020-079, приложен
3.2	РНП		Заключены соглашения с	15.04.2020	31.01.2020	Эрнст С. А.	

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету ХантыМансийского автономного округа - Югры на поддержку государственных программ (подпрограмм) субъектов Российской Федерации и муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской среды в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»" Соглашение от 18.12.2019г. №069-09-2020-079, приложен файл
3.2.1	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	23.01.2020	Маненков С. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 23.01.2020г. №71811000-1-2020-001, приложен файл.
3.2.2	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по	15.04.2020	23.01.2020	Фомин В. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 23.01.2020г. №71812000-1-2020-002, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			благоустройству общественных территорий в 2020 году				
3.2.3	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Сурцев Б. Ф.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71872000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.4	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Дейнека О. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71873000-1-2020-004, приложен файл.
3.2.5	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета	15.04.2020	24.01.2020	Дегтярев С. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году				(подпрограммы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Соглашение от 24.01.2020г. №71874000-1-2020-003, приложен файл.
3.2.6	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	23.01.2020	Тихонов В. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Соглашение от 23.01.2020г. №71875000-1-2020-004, приложен файл.
3.2.7	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Степура В. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Соглашение от 24.01.2020г. №71884000-1-2020-002, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.8	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	23.01.2020	Морозов А. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 23.01.2020г. №71885000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.9	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	23.01.2020	Гулина Н. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 23.01.2020г. №71877000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.10	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях	15.04.2020	31.01.2020	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году				31.01.2020г. №71876000-1-2020-004, приложен файл.
3.2.11	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	28.01.2020	Закирзянов Т. Р.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 28.01.2020г. №71878000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.12	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	30.01.2020	Ряшин М. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 30.01.2020г. №71871000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.13	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного	15.04.2020	23.01.2020	Бородкин А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году				Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Соглашение от 23.01.2020г. №71887000-1-2020-003, приложен файл.
3.2.14	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	23.01.2020	Ямашев И. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Соглашение от 23.01.2020г. №71879000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.15	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных	15.04.2020	23.01.2020	Лапковская Г. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" Соглашение от 23.01.2020г. №71818000-1-2020-002, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			территорий в 2020 году				
3.2.16	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Саломатин Б. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71819000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.17	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Куташова А. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71821000-1-2020-003, приложен файл.
3.2.18	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам	15.04.2020	24.01.2020	Набатов И. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а




ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году				"Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71824000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.19	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Трубецкой А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71826000-1-2020-004, приложен файл.
3.2.20	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	31.01.2020	Минулин К. Р.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 31.01.2020г. №71829000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.21	РПП		Заключение соглашений с	15.04.2020	24.01.2020	Пальчиков Н. Н.	






ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году				Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проекта а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71883000-1-2020-002, приложен файл.
3.2.22	РПП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями автономного округа о предоставлении субсидии из бюджета автономного округа бюджетам муниципальных образований округа в целях софинансирования мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.04.2020	24.01.2020	Мостовых Г. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на поддержку муниципальной программы (под программы) формирования современной городской среды в рамках регионального проект а "Формирование комфортной городской среды"" Соглашение от 24.01.2020г. №71816000-1-2020-003, приложен файл.
3.3	РНП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ по благоустройству общественных территорий в 2020 году	15.05.2020	15.05.2020	Эрнст С. А.	В работе. Риски неисполнения отсутствуют







ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.1	РПП		Заключение контрактов на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Дегтярев С. Ю.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.2	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	02.12.2019	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ 15П/2019 на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Экопарк «За Саймой» ИКЗ 193860200320486020100101900017111244 " Муниципальный контракт от 23.09.2019г. №15П/2019 , приложен файл. 2. "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № 35Б/2019 на выполнение работ по благоустройству объекта «Благоустройство территории, прилегающей к Храму Преображения Господня в микрорайоне 23А» ИКЗ 193860200320486020100102170014299244 " Муниципальный контракт от 02.12.2019г. №35Б/2019 , приложен файл.
3.3.3	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	26.03.2020	Ряшин М. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "МК 93/ЭА по благоустройству общественной территории по улице Лопарева в городе Ханты-Мансийске" Муниципальный контракт от 27.04.2020г. №93-ЭА, приложен файл.
3.3.4	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Тихонов В. В.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.5	РПП		Заключены контракты на	15.05.2020	15.05.2020	Дейнека О. А.	В работе. Риски незавершения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ				
3.3.6	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Закирзянов Т. Р.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.7	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Пальчиков Н. Н.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.8	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Гулина Н. А.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.9	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Сурцев Б. Ф.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.10	РПП		Заключены контракты на	15.05.2020	15.05.2020	Ямашев И. П.	






ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ				В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.11	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Морозов А. Н.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.12	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Степура В. И.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.13	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	26.07.2019	Бородин А. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт № 0187300005819000228(113.2019) на выполнение работ по благоустройству Мемориала Защитникам Отечества и первопроходцам земли Югорской в городе Югорске" Муниципальный контракт от 26.07.2019г. №0187300005819000228, <u>приложен файл.</u>
3.3.14	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	30.12.2019	Маненков С. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт на выполнение подрядных работ для муниципальных нужд Белоярского района" Муниципальный контракт от 30.12.2019г. №01873000085190002010001, <u>приложен файл.</u>
							




ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения






№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.15	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Фомин В. И.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.16	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Дубовик А. В.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.17	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Куташова А. П.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.18	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	28.10.2019	Трубецкой А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Муниципальный контракт № 01873000165190000290001 на выполнение работ по благоустройству территории общего пользования" Муниципальный контракт от 28.10.2019г. №01873000165190000290001, приложен файл.
3.3.19	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Набатов И. А.	В работе. Риски незавершения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.3.20	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Минулин К. Р.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.21	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Саломатин Б. А.	В работе. Риски незавершения отсутствуют
3.3.22	РПП		Заключены контракты на выполнение работ по результатам закупки товаров, работ и услуг в целях реализации муниципальных программ	15.05.2020	15.05.2020	Лапковская Г. В.	В работе. Риски незавершения отсутствуют

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

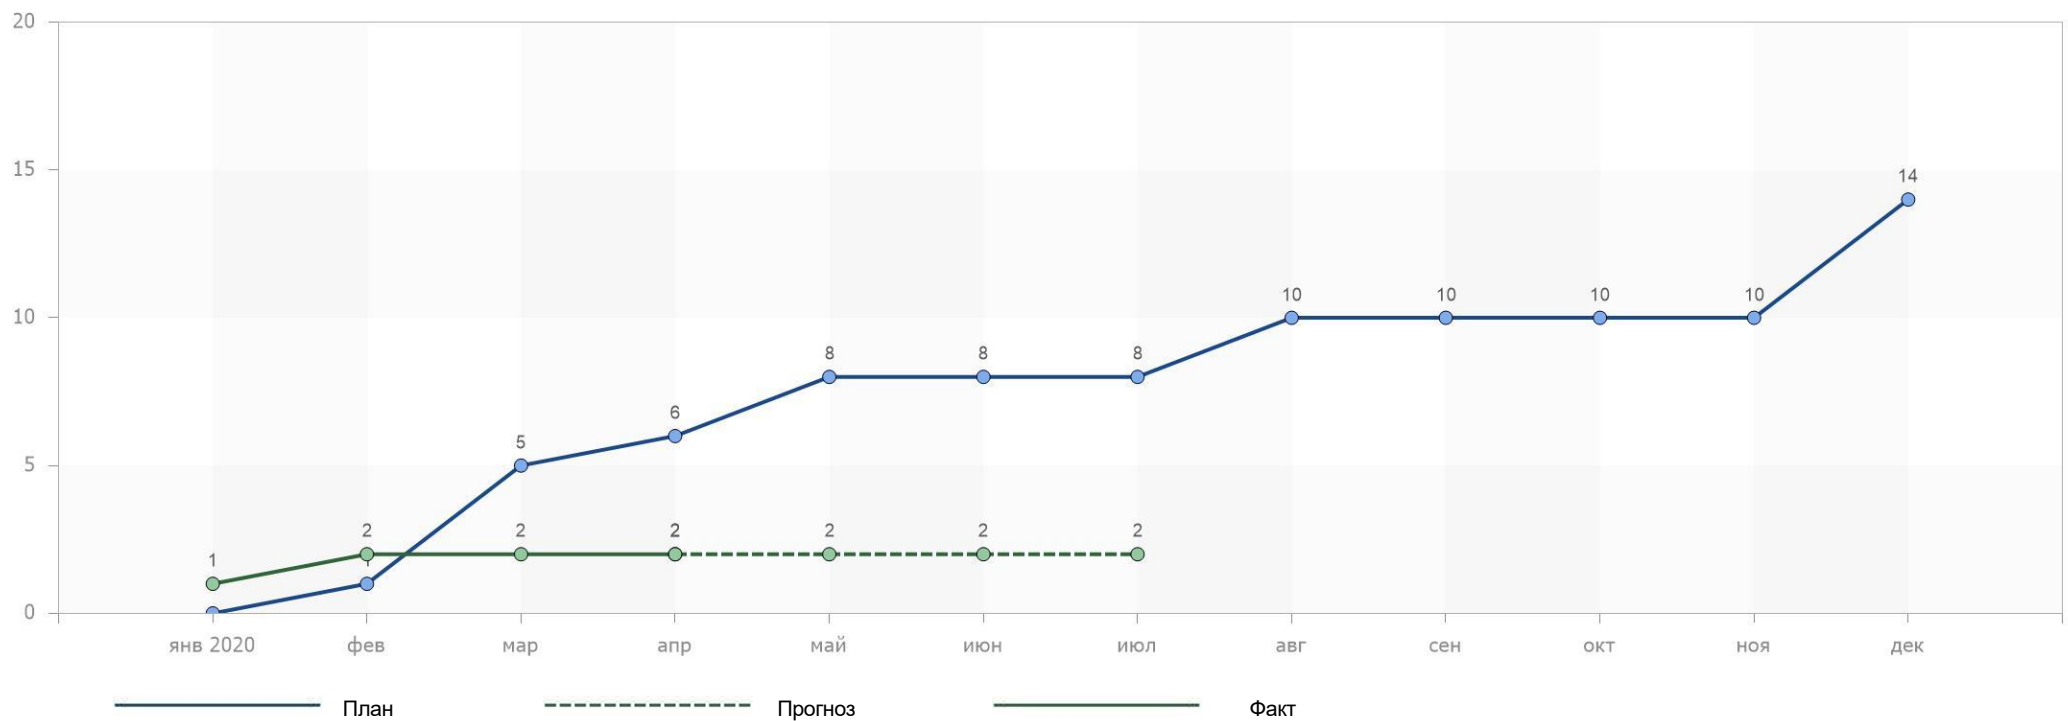


Рис. 1. "(F2-71) Формирование комфортной городской среды (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

