

Руководитель  
регионального проекта —  
Ракитский Алексей Алексеевич

(подпись)





08.05.2020

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

"(F1-71) Жилье (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

#### Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений	Наличие отклонений

1. Ключевые риски				
№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 30 апреля 2020 года  
Всего: 244 987,70 тыс. руб

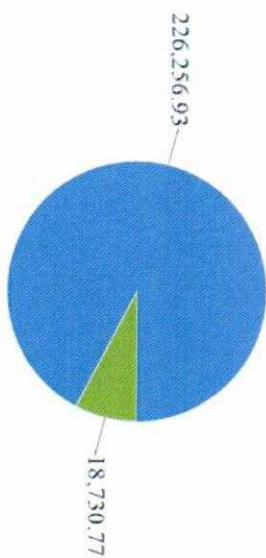

Сводный бюджет МО  
на 30 апреля 2020 года  
Всего: 16 604,70 тыс. руб

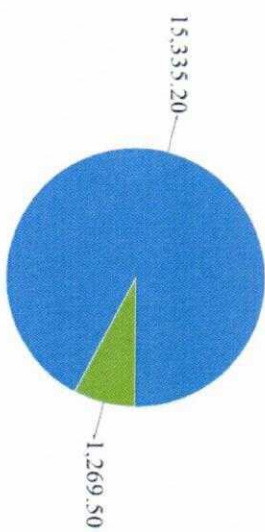

Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 30 апреля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники  
на 30 апреля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено      Риски исполнения      Остаток финансовых средств

Отсутствие отклонений      Наличие отклонений      Наличие критических отклонений      Сведения не представлены      Прогнозные сведения

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

## Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		(02.03.03) Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства								
1			261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	20 000,27	7,65		
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	20 000,27	7,65	рисков нет	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	244 987,70	244 987,70	244 987,70	0,00	18 730,77	7,65	рисков нет	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	244 987,70	244 987,70	244 987,70	0,00	18 730,77	7,65	рисков нет	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	20 000,27	7,65	рисков нет	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Противозначные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(4)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	20 000,27	7,65		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	20 000,27	7,65		
бюджет субъекта Российской Федерации			244 987,70	244 987,70	244 987,70	0,00	18 730,77	7,65		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			244 987,70	244 987,70	244 987,70	0,00	18 730,77	7,65		
бюджеты муниципальных образований			261 592,40	261 592,40	261 592,40	0,00	20 000,27	7,65		
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие  
отклонений





 Наличие  
отклонений

 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Прогнозные  
сведения

## 4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	 1
2		Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации	 1

ИС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие  
отклонений

 Наличие  
отклонений




 Наличие критических  
отклонений

 Сведения не  
представлены

 Пропущены  
сведения

## 5. Динамика достижения контрольных точек

## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства. Значение: 1, на дату 20.01.2021	20.01.2021	20.01.2021	Ракитский А. А.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет №, приложен файл. отклонений нет Предоставлена информация из 1.
1.1	РРП		Реализованы проекты по развитию территорий, расположенных в границах населенных пунктов, предусматривающих строительство жилья, которые включены в государственные программы субъектов Российской Федерации по развитию жилищного строительства	31.12.2020	15.07.2020	Ракитский А. А.	В работе.
1.1.1	РРП		Реализованы мероприятия по стимулированию программ развития жилищного	15.07.2020	15.07.2020	Ракитский А. А.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "о расходах" Отчет №, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			строительства субъектов Российской Федерации				
2			Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации Значение: 0.903, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2020	Ракитский А. А.	Информация по значению результата: В работе. Существует риск: изменение законодательства, Причина риска: изменение законодательства, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. направлено предложение в Правительство РФ, срок исполнения 31.12.2020. Просрочка 366 дней. Предоставлена информация 0.903 из 0.903. Информация по результату: Существует риск: Изменение законодательства РФ, Причина риска: Изменение в 214-ФЗ части перехода строительной отрасли на проектное финансирование с использованием эскроу счетов (отсутствие возможности привлечения средств бюджета для строительства объектов), Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2019г. Предлагаемые решения: 1. Предложено внесение изменений в федеральное законодательство направлены в Правительство Российской Федерации, срок исполнения 31.12.2020.
2.1	РРП		Обеспечен ввод жилья в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2019 году – 0,903 млн. кв.м.	31.12.2019	31.12.2020	Ракитский А. А.	В работе. Просрочка 366 дней. Существует риск: изменение законодательства, Причина риска: изменение законодательства Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. направлены предложения в Правительство РФ, срок исполнения 31.12.2020.
2.1.1	РРП		Обеспечен объем ввода в многоквартирных жилых домах	31.12.2019	31.12.2020	Ракитский А. А.	В работе. Просрочка 366 дней. Подтверждающие документы: "об исполнении графика ввода жилья" Информационная справка Депзоя Югры от 01.05.2020г. №6/н, приложен файл. Существует риск: изменение законодательства, Причина риска: изменение законодательства, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 31.12.2020г. Предлагаемые решения: 1. направл

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							предложения в Правительство РФ, срок исполнения 31.12.202

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;  
РНИ - руководитель национального проекта.



Отсутствие  
отклонений



Наличие  
отклонений



Наличие критических  
отклонений



Сведения не  
представлены



Прогнозные  
сведения

# Динамика достижения контрольных точек

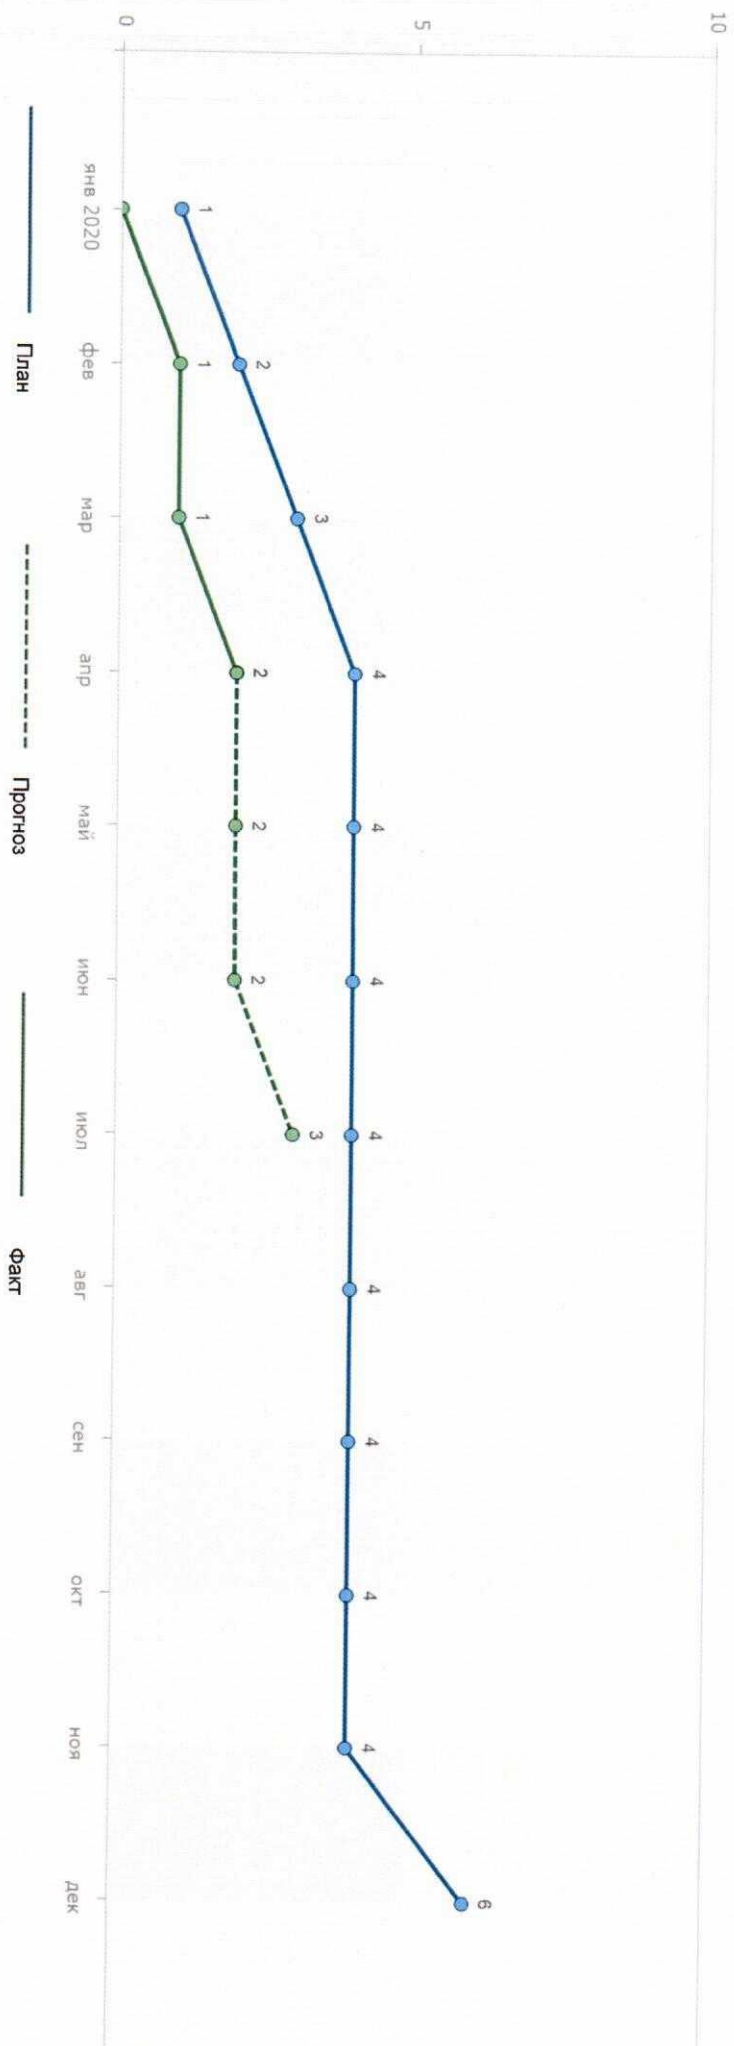


Рис. 1. "(F1-71) Жилые (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

