

Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич
(подпись)
05.02.2020






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ЯНВАРЯ 2020 ГОДА

"(Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Сводный бюджет МО
на 31 января 2020 года
Всего: 247 358,60 тыс. руб.

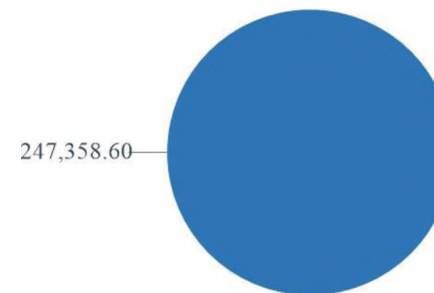

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники
на 31 января 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб.



■ Фактически исполнено
 ■ Риски исполнения
 ■ Остаток финансовых средств

■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений
 ■ Сведения не представлены
 ▨ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		(02) Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 815,2	7 815,2	7 815,2	0	0	0	
1.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 815,2	7 815,2	7 815,2	0	0	0	
1.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	7 815,2	7 815,2	7 815,2	0	0	0	
1.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
2.		(07) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	3 793 288,80	3 793 288,80	3 793 288,80	0	0	0	
2.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 793 288,80	3 793 288,80	3 793 288,80	0	0	0	
2.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3 445 855,6	3 445 855,6	3 445 855,6	0	0	0	


		Федерации							
2.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.		бюджеты муниципальных образований	347 433,2	347 433,2	347 433,2	0	0	0	
2.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
3.		(03) Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	45 799,5	45 799,5	45 799,5	0	0	0	
3.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	45 799,5	45 799,5	45 799,5	0	0	0	
3.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	45 799,5	45 799,5	45 799,5	0	0	0	
3.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
3.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
4.		(03) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	864 224,30	864 224,30	864 224,30	0,00	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	864 224,30	864 224,30	864 224,30	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано

									со 2 квартала 2020 года
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	770 062,50	770 062,50	770 062,50	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	94 161,80	94 161,80	94 161,80	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные Сведения


5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

		бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований							
7.1.3		бюджеты муниципальных образований	100 575,60	100 575,60	100 575,60	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала
7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений






 Сведения не представлены




 Прогнозные сведения

5.Динамика достижения контрольных точек
Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1	РПП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
 РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений
  Наличие отклонений
  Наличие критических отклонений
  Сведения не представлены
  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.1	РПП		Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.
2			Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.041, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.041.
2.1	РПП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Дренин А. А.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений




Сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РРП		Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
3			Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Значение: 1, на дату 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.1.1	РПП		Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ	30.04.2020	30.04.2020	Цулая Л. В.	В работе.
4			Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 70.
4.1	РПП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
4.1.1	РПП		Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений







Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 70.
5.1	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	10.01.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 10.01.2020г. №10-Исх-65, приложен файл.
5.1.1	РПП		Разработка и направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примерных соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме	31.12.2019	10.01.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 10.01.2020г. №10-Исх-65, приложен файл.
5.2	РПП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.1	РПП		Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
6			Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	01.01.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 0 из 0.
6.1	РПП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	01.01.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл
6.1.1	РПП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	31.12.2019	01.01.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 1805, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1805.
7.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
7.1.1	РРП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	30.04.2020	30.04.2020	Дренин А. А.	В работе.
8			Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 1087, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 730 из 1087.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1	РПП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
8.1.1	РПП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	15.04.2020	15.04.2020	Дренин А. А.	В работе.
9			100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Значение: 25, на дату 30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 25.
9.1	РПП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.1	РПП		Проведение семинара для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

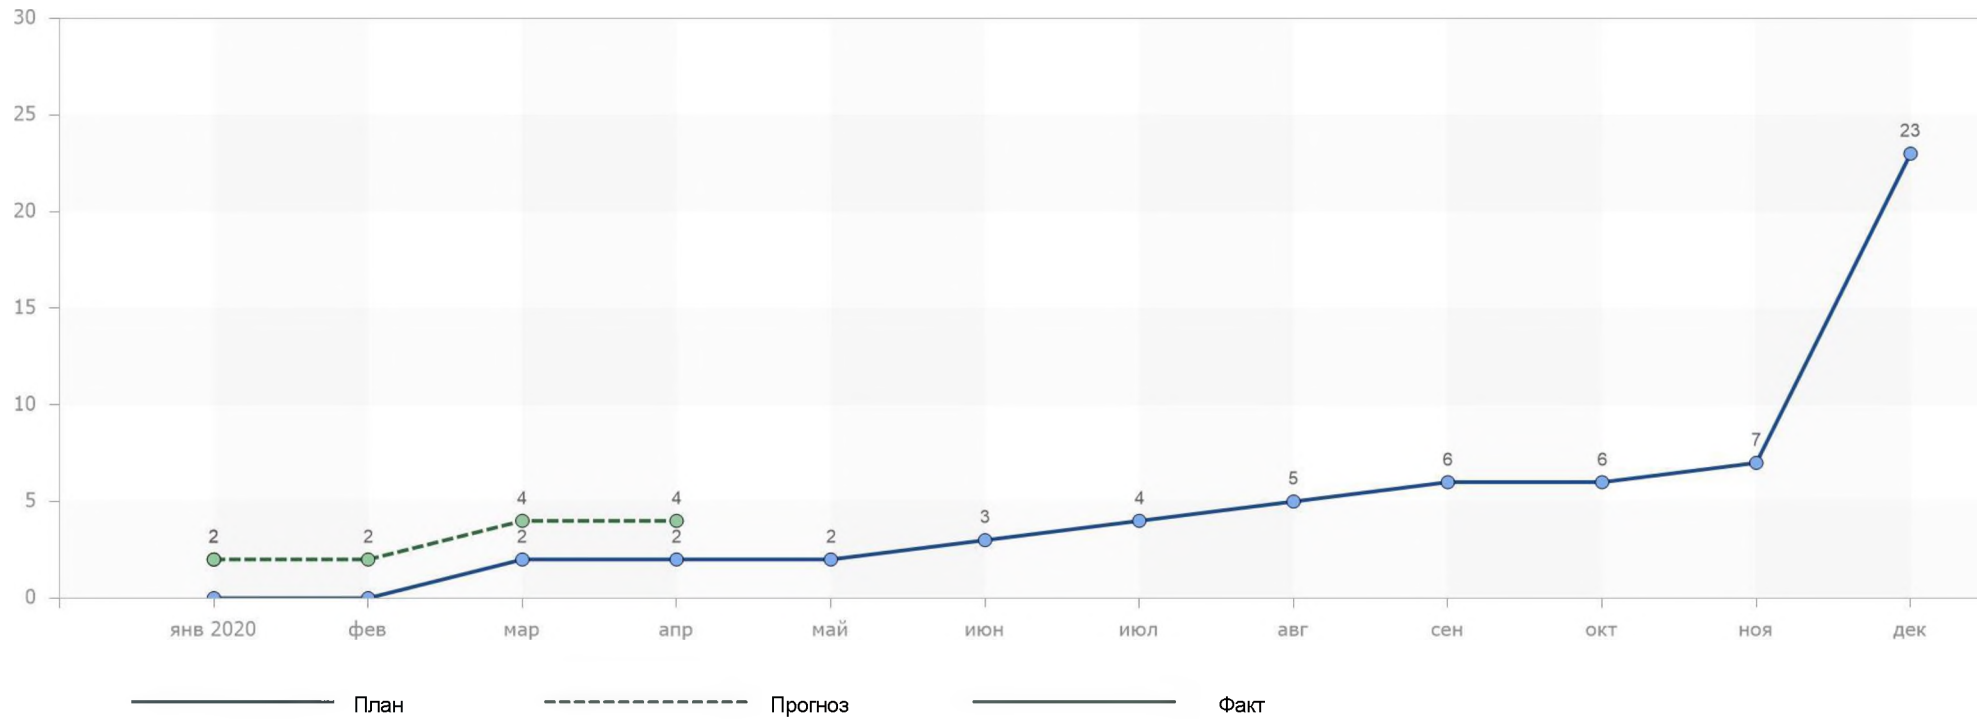


Рис. 1. "(E1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

- Отсутствие отклонений
- Наличие отклонений
- Наличие критических отклонений
- Сведения не представлены
- Прогнозные сведения
