

Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич

(подпись)

08.05.2020






ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 30 АПРЕЛЯ 2020 ГОДА

"(E1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 30 апреля 2020 года
Всего: 5 720 622,50 тыс. руб

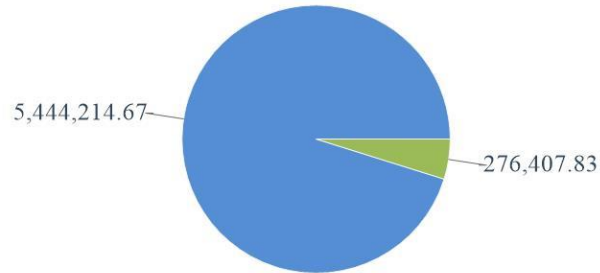

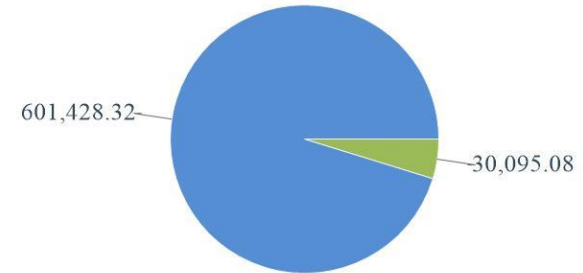

Сводный бюджет МО
на 30 апреля 2020 года
Всего: 631 523,40 тыс. руб




Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 30 апреля 2020 года
Всего: 0,00 тыс. руб


 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств

² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(01.16.16) Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано в 3 квартале 2020 года
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано в 3 квартале 2020 года
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		(02) Поддержка образования для	18 882,20	18 882,20	18 882,20	7 131,31	3 318,37	17,57	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам							
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	18 882,20	18 882,20	18 882,20	7 131,31	3 318,37	17,57	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	18 882,20	18 882,20	18 882,20	7 131,31	3 318,37	17,57	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3		(03) Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана	45 799,50	45 799,50	45 799,50	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах							
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	45 799,50	45 799,50	45 799,50	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется в 3 квартале 2020 года
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	45 799,50	45 799,50	45 799,50	0,00	0,00	0,00	Освоение средств планируется в 3 квартале 2020 года
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4		(03) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в	1 538 855,10	1 538 855,10	1 538 855,10	1 538 855,10	38 336,27	2,50	






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		сельской местности и поселках городского типа							
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 538 855,10	1 538 855,10	1 538 855,10	1 538 855,10	38 336,27	2,50	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 377 230,20	1 377 230,20	1 377 230,20	1 377 230,20	34 502,64	2,51	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	1 377 230,20	1 377 230,20	1 377 230,20	0,00	0,00	0,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 535 885,11	1 535 885,11	1 535 885,11	161 624,90	3 833,63	0,25	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5		(06) 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	7 623,50	7 623,50	7 623,50	7 623,50	2 514,66	32,99	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 623,50	7 623,50	7 623,50	7 623,50	2 514,66	32,99	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	7 623,50	7 623,50	7 623,50	7 623,50	2 514,66	32,99	





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации							
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6		(07) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	3 419 217,90	3 419 217,90	3 419 217,90	2 456 672,42	149 341,88	4,37	
6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 419 217,90	3 419 217,90	3 419 217,90	2 456 672,42	149 341,88	4,37	
6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 081 196,20	3 081 196,20	3 081 196,20	2 118 650,72	134 408,65	4,36	
6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	3 042 196,20	3 042 196,20	3 042 196,20	0,00	0,00	0,00	
6.1.3		бюджеты муниципальных образований	3 380 217,90	3 380 217,90	3 380 217,90	338 021,70	14 933,23	0,44	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7		(21) Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 318 767,70	1 318 767,70	1 318 767,70	0,00	113 261,22	8,59	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 318 767,70	1 318 767,70	1 318 767,70	0,00	113 261,22	8,59	
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	1 186 890,90	1 186 890,90	1 186 890,90	0,00	101 933,00	8,59	
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	905 180,67	905 180,67	905 180,67	0,00	0,00	0,00	
7.1.3		бюджеты муниципальных образований	1 037 057,47	1 037 057,47	1 037 057,47	0,00	11 328,22	1,09	
7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			6 352 145,90	6 352 145,90	6 352 145,90	4 010 282,33	306 502,91	4,83	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	6 352 145,90	6 352 145,90	6 352 145,90	4 010 282,33	306 772,41	4,83	
		бюджет субъекта Российской Федерации	5 720 622,50	5 720 622,50	5 720 622,50	3 510 635,73	276 677,32	4,84	
		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	5 324 607,07	5 324 607,07	5 324 607,07	0,00	0,00	0,00	
		бюджеты муниципальных образований	5 956 130,47	5 956 130,47	5 956 130,47	499 646,60	30 095,08	0,51	
		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие
отклонений


 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены


 Прогнозные
сведения


4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	
2		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	
3		Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	
4		100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	
5		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	
6		Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	
7		Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	


³ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений




 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены






 Прогнозные сведения






5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1	РПП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	03.04.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иной вид документа отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Депобразования и молодежи Югры от 03.04.2020г. №224, приложен файл.
1.1.1	РПП		Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская	31.03.2020	03.04.2020	Васяева О. И.	Выполнено. Просрочка 3 дней. Подтверждающие документы: 1. "Служебная записка" Иной вид документа отдела адаптированных образовательных программ и итоговой аттестации Депобразования и молодежи Югры от 03.04.2020г. №224, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»				
1.2	РПП		Получен отчет о деятельности организации	30.06.2020	30.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
1.2.1	РПП		Подготовка информационно-аналитического отчета по реализации мероприятия за первое полугодие 2020 года	30.06.2020	30.06.2020	Васяева О. И.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
2			Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.041, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 0 из 0.041.
2.1	РПП		Принято решение о создании (реорганизации) организации (структурного подразделения)	30.06.2020	30.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.1.1	РПП		Внесение изменений в локальные акты общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, на базе которых будут открыты центры "Точка роста"	30.06.2020	30.06.2020	Смирнов И. В.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
2.1.2	РПП		Осуществление подбора кадрового состава центров "Точка Роста"	30.06.2020	30.06.2020	Смирнов И. В.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
2.2	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.07.2020	31.07.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
2.2.1	РПП		Подготовка площадок центров "Точка роста" на базе общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: - брендирование зон (проведение ремонтов); - оформление помещений в соответствии с фирменным стилем центров "Точка роста"	31.07.2020	31.07.2020	Смирнов И. В.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
2.3	РПП		Закупка включена в план закупок	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений







 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.3.1	РПП		Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"	31.05.2020	31.05.2020	Смирнов И. В.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
3			Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Значение: 1, на дату 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2020	30.04.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.
3.1.1	РПП		Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации	30.04.2020	30.04.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о реализации мероприятия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			общеобразовательных программ				
4			Создано не менее 3 525 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 2625, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 0 из 2625.
4.1	РПП		Организация работы с Органами местного самоуправления	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
4.1.1	РПП		Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
4.2	РПП		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	01.06.2020	01.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
4.2.1	РПП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-	01.06.2020	01.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Мансийского автономного округа – Югры				
5			Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 665, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 120 из 665.
5.1	РПП		Организация работы с Органами местного самоуправления	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
5.1.1	РПП		Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
5.2	РПП		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.06.2020	01.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
5.2.1	РПП		Осуществление мониторинга	01.06.2020	01.06.2020	Дренин А. А.	


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.







 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа				В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
5.3	РПП		Организация работы с Органами местного самоуправления	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
5.3.1	РПП		Подготовка отчета о расходах средств субсидии	30.06.2020	30.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
6			100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Значение: 25, на дату 31.12.2021	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 0 из 25.
6.1	РПП		Проведение мониторинга в области оценки качества образования	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
6.1.1	РПП		Мониторинг учебно-	31.05.2020	31.05.2020	Васяева О. И.	


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			методических комплексов, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ				В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
7			Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности Значение: 2446, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Отсутствуют риски недостижения результата Предоставлена информация : 730 из 2446.
7.1	РПП		Организация работы с Органами местного самоуправления	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
7.1.1	РПП		Заключение соглашений с Органами местного самоуправления о предоставлении субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры местным бюджетам	31.05.2020	31.05.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
7.2	РПП		Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	01.06.2020	01.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.2.1	РПП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	01.06.2020	01.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия
7.3	РПП		Организация работы с Органами местного самоуправления	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения контрольной точки
7.3.1	РПП		Подготовка отчета о расходах средств субсидии	30.06.2020	30.06.2020	Дренин А. А.	В работе. Отсутствуют риски неисполнения мероприятия


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

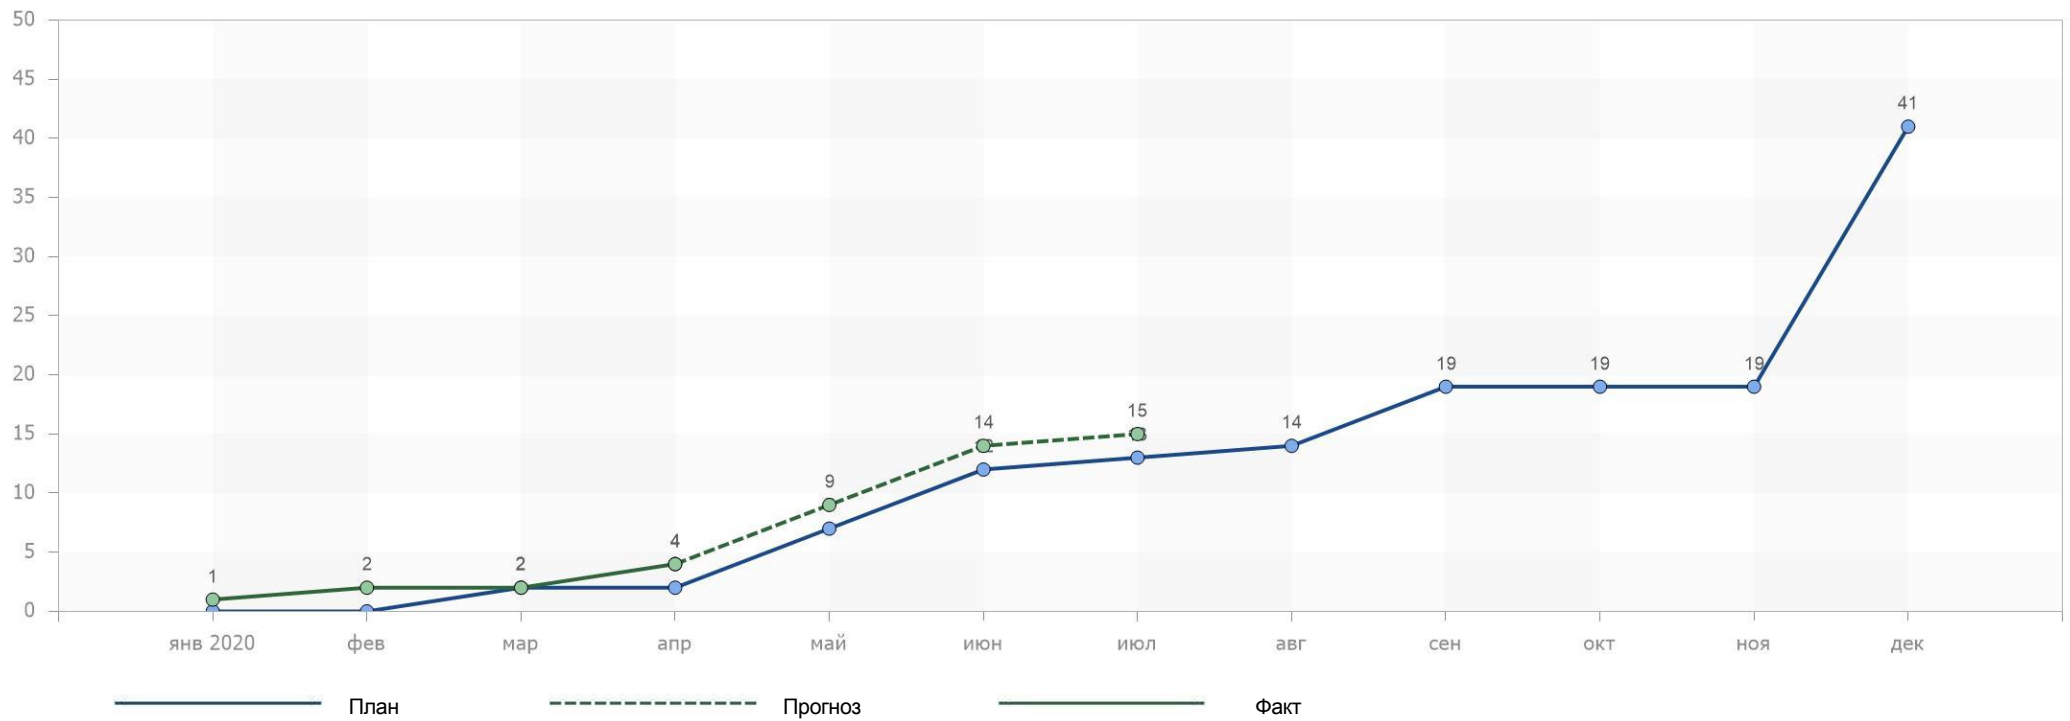


Рис. 1. "(Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения
