


Руководитель
регионального проекта —
Датылов Артур Альбертович

(подпись)

03.06.2020





ОДОВЕРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 МАЯ 2020 ГОДА

"(А2-71) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений

2

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
показания


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 мая 2020 года

Всего: 109 479,80 тыс. руб

Сводный бюджет МО
на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

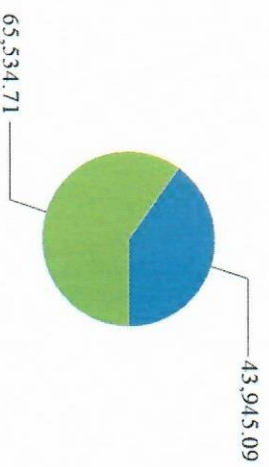

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 31 мая 2020 года

Всего: 0,00 тыс. руб



Фактически исполнено



Риски исполнения



Остаток финансовых средств



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений



Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Протозонные
нарушения


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.


Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		(03) Реализация некоммерческими организациями 5 творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	109 479,80	109 479,80	109 479,80	65 534,71	65 534,71	59,86		
1										
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	109 479,80	109 479,80	109 479,80	65 534,71	65 534,71	59,86		
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	109 479,80	109 479,80	109 479,80	65 534,71	65 534,71	59,86		
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие
отклонений

 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			109 479,80	109 479,80	109 479,80	65 534,71	65 534,71	59,86		
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			109 479,80	109 479,80	109 479,80	65 534,71	65 534,71	59,86		
бюджет субъекта Российской Федерации			109 479,80	109 479,80	109 479,80	65 534,71	65 534,71	59,86		
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

 Отсутствие
отклонений





 Наличие
отклонений

 Наличие критических
отклонений

 Сведения не
представлены

 Прогнозные
оценки




4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		Участие творческих коллективов автономного округа в фестивале любительских творческих коллективов	<div><div>1</div><div>2</div></div>
2		Участие в волонтерских проектах в сфере культуры не менее 1137 волонтеров	<div><div>1</div></div>
3		Реализация некоммерческими организациями 5 творческих проектов в области музыкального, театрального и изобразительного искусства, а также творческих проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, включая мероприятия, направленные на популяризацию русского языка и литературы, народных художественных промыслов и ремесел	
4		Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования	<div><div>1</div><div>2</div></div>

³ ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНЦ - руководитель национального проекта.

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			Участие творческих коллективов автономного округа в фестивале любительских творческих коллективов Значение: 2, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Носырева Е. А.	Информация по значению результата: В работе. Работа ведется в плановом режиме Предоставлена информация : 2 из 2.
1.1.	РРП		Проведен Региональный конкурс любительских творческих коллективов	01.04.2020	26.06.2020	Носырева Е. А.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Письмо ФГУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова"" Приказ ФГУК "Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова" от 19.03.202 №184/83, приложен файл. Риск снят. Отмена Регионального конкурса любительских и творческих коллективов, Причина риска. Распространение новой коронавирусной инфекции , Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принятие решения о переносе конкурса, срок исполнения 01.06.2020. Во исполнение приказа Минкультуры РФ от 16.03.2020 №357 в целях предупреждения новой коронавирусной инфекции перенесен Региональный конкурс любительских творческих коллективов до 26 июня 2020 года, вместе со всероссийским фестивалем.
1.1.1	РРП		Проведение Регионального конкурса любительских творческих коллективов	01.04.2020	26.06.2020	Носырева Е. А.	В работе. Просрочка 86 дней. Подтверждающие документы: 1 "Письмо ФБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова»" Письмо Письмо ФБУК «Государственный Российский Дом народного творчества имени В.Д. Поленова» от 19.03.2020г. №184/83, приложен файл. Риск снят. Отмена Регионального конкурса любительских и

ПС - президентом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет, РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений




Сведения не представлены



Прогнозные отклонения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							творческих коллективов. Причина риска: Распространение но коронавирусной инфекции. Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 01.06.2020г. Предлагаемые решения: 1. Принять решения о переносе конкурса, срок исполнения 01.06.2020. В исполнение приказа Минкультуры РФ от 16.03.2020 №357 в т.п.предупреждения новой коронавирусной инфекции пренесен Региональный конкурс любительских творческих коллективов 26 июня 2020 года, вместе со всероссийским фестивалем.
1.2.	РРП		Заключены Соглашения с Лауреатам Регионального конкурса любительских творческих коллективов	01.06.2020	01.06.2020	Носырева Е. А.	В работе. работа ведется в плановом режиме
1.2.1	РРП		Заключение Соглашений с Лауреатам Регионального конкурса любительских творческих коллективов	01.06.2020	01.06.2020	Носырева Е. А.	В работе. Работа ведется в плановом режиме
1.3.	РРП		Участие представителей автономного округа – Лауреатов Регионального конкурса любительских творческих коллективов – во Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов	01.08.2020	01.08.2020	Носырева Е. А.	В работе. Подготовка к участию представителей автономного округа – Лауреатов Регионального конкурса любительских творческих коллективов – во Всероссийском фестивале-конку любительских творческих коллективов ведется в плановом режиме
1.3.1	РРП		Подготовка к участию представителей автономного округа – Лауреатов Регионального конкурса любительских творческих коллективов – во	01.08.2020	01.08.2020	Носырева Е. А.	В работе. Подготовка к участию представителей автономного округа – Лауреатов Регионального конкурса любительских творческих коллективов – во Всероссийском фестивале-конку любительских творческих коллективов ведется в плановом режиме

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.			Всероссийском фестивале-конкурсе любительских творческих коллективов				
			Участие в волонтерских проектах в сфере культуры не менее 1137 волонтеров Значение: 285, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Носырева Е. А.	Информация по значению результата: В работе. Работа ведется в плановом режиме Предоставлена информация : 285 из 285.
2.1.	РРП		Сформирован план работы по привлечению добровольцев учреждениями культуры	01.04.2020	01.04.2020	Носырева Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О плане работ привлечению добровольцев учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Приказ Депкульту Югры от 01.04.2020г. №09-ОД-82/01-09, приложен файл. Сформирован план работы по привлечению добровольцев учреждениями культуры
2.1.1	РРП		Формирование плана работы по привлечению добровольцев учреждениями культуры	01.04.2020	01.04.2020	Носырева Е. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. ""О плане работ привлечению добровольцев учреждениями культуры Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"" Приказ Депкульт. Югры от 01.04.2020г. №09-ОД-82/01-09, приложен файл. Сформирован план работы по привлечению добровольцев учреждениями культуры
3.			Количество специалистов, прошедших повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования Значение: 474, на дату 25.12.2020	25.12.2020	25.12.2020	Тырикова О. Н.	Информация по значению результата: В работе. Работа ведется в плановом режиме Предоставлена информация : 474 из 474.
3.1.	РРП		Подготовлены и направлены письма в муниципальные образования автономного	01.05.2020	30.01.2020	Тырикова О. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письма Депкультуры Югры о потребности перечня программ по повышению квалификации" Письмо Депкультуры Югры от

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ЦК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие
отклонений



Наличие
отклонений








Наличие критических
отклонений



Сведения не
представлены



Прогнозные
отклонения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			округа, в подведомственные учреждения культуры о потребности перечня программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке				30.01.2020г. №-, приложен файл. Подготовлены и направлены письма в муниципальные образования автономного округа, в подведомственные учреждения культуры о потребности перечня программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке
3.1.1	РРП		Подготовка и направление письма в муниципальные образования автономного округа, в подведомственные учреждения культуры о потребности перечня программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке	01.05.2020	30.01.2020	Тырикова О. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Письма Депутаты Югры о потребности перечня программ по повышению квалификации" Письмо Депутаты Югры от 30.01.2020г. №-, приложен файл. Подготовлены и направлены письма в муниципальные образования автономного округа, в подведомственные учреждения культуры о потребности перечня программ по повышению квалификации и профессиональной переподготовке
3.2.	РРП		Сформированы потребности МО, подведомственных учреждений культуры в программах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке	01.06.2020	01.06.2020	Тырикова О. Н.	В работе. Формирование потребности МО, подведомственных учреждений культуры в программах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ведется в плановом режиме
3.2.1	РРП		Формирование потребности МО, подведомственных учреждений культуры в программах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке	01.06.2020	01.06.2020	Тырикова О. Н.	В работе. Формирование потребности МО, подведомственных учреждений культуры в программах по повышению квалификации и профессиональной переподготовке ведется в плановом режиме
3.3.	РРП		Направление заявки с целью	01.07.2020	01.07.2020	Тырикова О. Н.	В работе. Подготовка заявки с целью повышения квалификации

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры				базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ведется в плановом режиме
3.3.1	РРП		Направлена заявка с целью повышения квалификации на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры	01.07.2020	01.07.2020	Тырикова О. Н.	В работе. Подготовка заявки с целью повышения квалификац базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры ведется в плановом режиме

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Противоположные тенденции

Динамика достижения контрольных точек

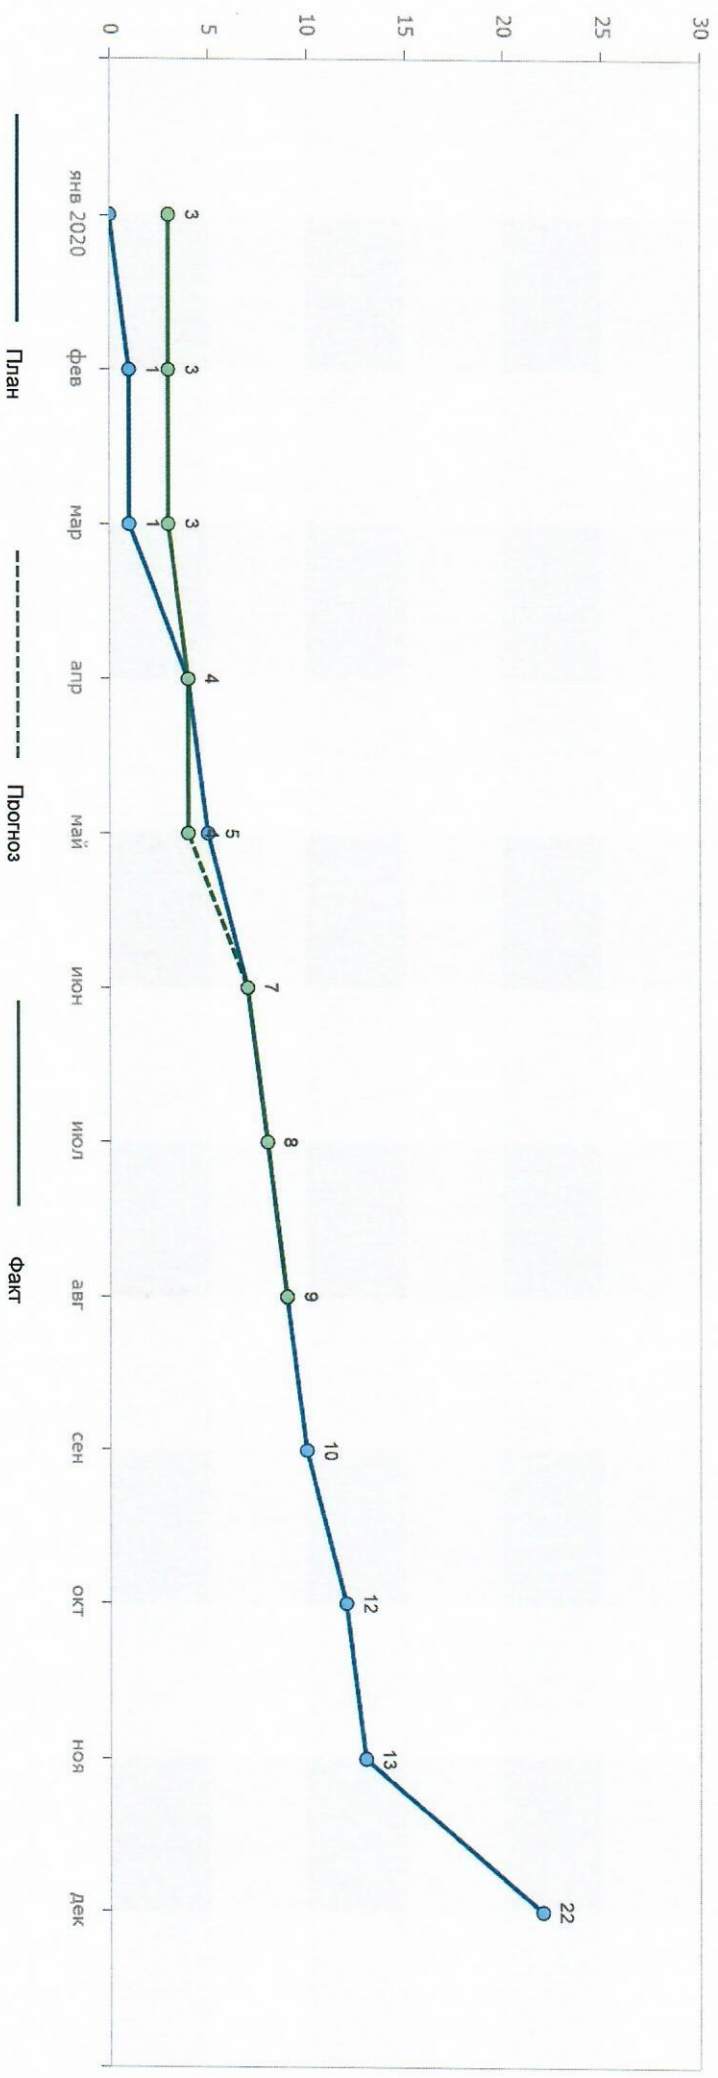


Рис. 1. "(А2-71) Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Теоретские люди») (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 1

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

