

Руководитель  
регионального проекта —  
Дренин Алексей Анатольевич

(Подпись)

03.03.2020





ОДОБРЕН

## О Т Ч Е Т

### О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 29 ФЕВРАЛЯ 2020 ГОДА


"(E1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"


#### Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>


## 1. Ключевые риски


№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

### 3. Статус исполнения бюджета<sup>2</sup>

Бюджет субъекта  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 5 834 747,2 тыс. руб.



Сводный бюджет МО  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 551 787,80 тыс. руб.



Бюджеты государственных внебюджетных фондов  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб.

Внебюджетные источники  
на 29 февраля 2020 года  
Всего: 0,00 тыс. руб.

■ Фактически исполнено      ■ Риски исполнения      ■ Остаток финансовых средств

<sup>2</sup> При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

■ Отсутствие отклонений      ■ Наличие отклонений      ■ Наличие критических отклонений      ■ Сведения не представлены      ■ Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		( 02 ) Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам	7 815,2	7 815,2	7 815,2	0	0	0	
1.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	7 815,2	7 815,2	7 815,2	0	0	0	
1.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	7 815,2	7 815,2	7 815,2	0	0	0	
1.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.1.3.		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
1.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
2.		( 07 ) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	3 393 774,8	3 393 774,8	3 393 774,8	0	0	0	
2.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 393 774,8	3 393 774,8	3 393 774,8	0	0	0	

2.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	3 086293,0	3 086293,0	3 086293,0	0	0	0	
2.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
2.1.3.		бюджеты муниципальных образований	307481,8	307481,8	307481,8	0	0	0	
2.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
3.		( 03 ) Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах	45 799,5	45 799,5	45 799,5	0	0	0	
3.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	45 799,5	45 799,5	45 799,5	0	0	0	
3.1.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	45 799,5	45 799,5	45 799,5	0	0	0	
3.1.2.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
3.1.3.		бюджеты муниципальных образований	0	0	0	0	0	0	
3.4.		внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	
4.		(03) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	1 359 910,8	1 359 910,80	1 359 910,8	991 742,20	0,00	0,00	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 359 910,8	1 359 910,8	1 359 910,8	991 742,20	0,00	0,00	Освоение средств запланировано





6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.		(21) Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	1 005 756,40	1 005 756,40	1 005 756,40	0,00	0,00	0,00	
7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	1 005 756,40	1 005 756,40	1 005 756,40	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 год
7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	905 180,80	905 180,80	905 180,80	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала 2020 года
7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.1.3		бюджеты муниципальных образований	100 575,60	100 575,60	100 575,60	0,00	0,00	0,00	Освоение средств запланировано со 2 квартала
7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			5 834 747,2	5 834 747,2	5 834 747,2	999 365,70	1 040,46	0,02	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			5 834 747,2	5 834 747,2	5 834 747,2	999 365,70	1 040,46	0,02	
бюджет субъекта Российской Федерации			5 282 959,4	5 282 959,4	5 282 959,4	999 365,70	0,00	0,00	



межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований	551 787,80	551 787,80	551 787,80	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений






Сведения не представлены












Прогнозные сведения







## 5.Динамика достижения контрольных точек






## Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий






№ п/п	Уровень	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация: 0 из 1.
1.1	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.
1.1.1	РРП		Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.
2			Обновлена материально-техническая база для	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата:



			формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.041, на дату 31.12.2020				В работе. Предоставлена информация : 0 из 0.041.
2.1	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Дренин А. А.	В работе.
2.1.1	РРП		Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
3			Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Значение: 1, на дату 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1.
3.1	РРП			31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.

			Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение				
3.1.1	РРП		Сбор заявок по потребности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в учебниках и учебных пособиях для реализации общеобразовательных программ	30.04.2020	30.04.2020	Цулая Л. В.	В работе.
4			Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 70.
4.1	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
4.1.1	РРП		Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
5				31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата:

			Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 70, на дату 31.12.2024				В работе. Предоставлена информация : 0 из 70.
5.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	10.01.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 10.01.2020г. №10-Исх-65, приложен файл.
5.1.1	РРП		Разработка и направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примерных соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме	31.12.2019	10.01.2020	Смирнов И. В.	Выполнено. Просрочка 10 дней. Подтверждающие документы: 1. "О направлении информации" Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 10.01.2020г. №10-Исх-65, приложен файл.
5.2	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
5.2.1	РРП		Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
6			Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для	31.12.2019	01.01.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет по результатам мониторинга" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Просрочка 1 день. Предоставлена информация : 0 из 0.

			школьников") Значение: 0, на дату 31.12.2019				
6.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	01.01.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл.
6.1.1	РРП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	31.12.2019	01.01.2020	Дренин А. А.	Выполнено. Просрочка 1 дней. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.01.2020г. №б/н, приложен файл.
7			Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 1805, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 1805.
7.1	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
7.1.1	РРП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	30.04.2020	30.04.2020	Дренин А. А.	В работе.
8				31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата:


			Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 1087, на дату 31.12.2020				В работе. Предоставлена информация : 730 из 1087.
8.1	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
8.1.1	РРП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	15.04.2020	15.04.2020	Дренин А. А.	В работе.
9			100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Значение: 25, на дату 30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 0 из 25.
9.1	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
9.1.1	РРП			31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.


			Проведение семинара для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР				
9.1.2	РРП		Мониторинг учебно-методический комплексов, используемых в образовательных организациях при подготовке обучающихся к ЕГЭ и основному государственному экзамену	31.05.2020	31.05.2020	Васяева О. И.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения



## Динамика достижения контрольных точек

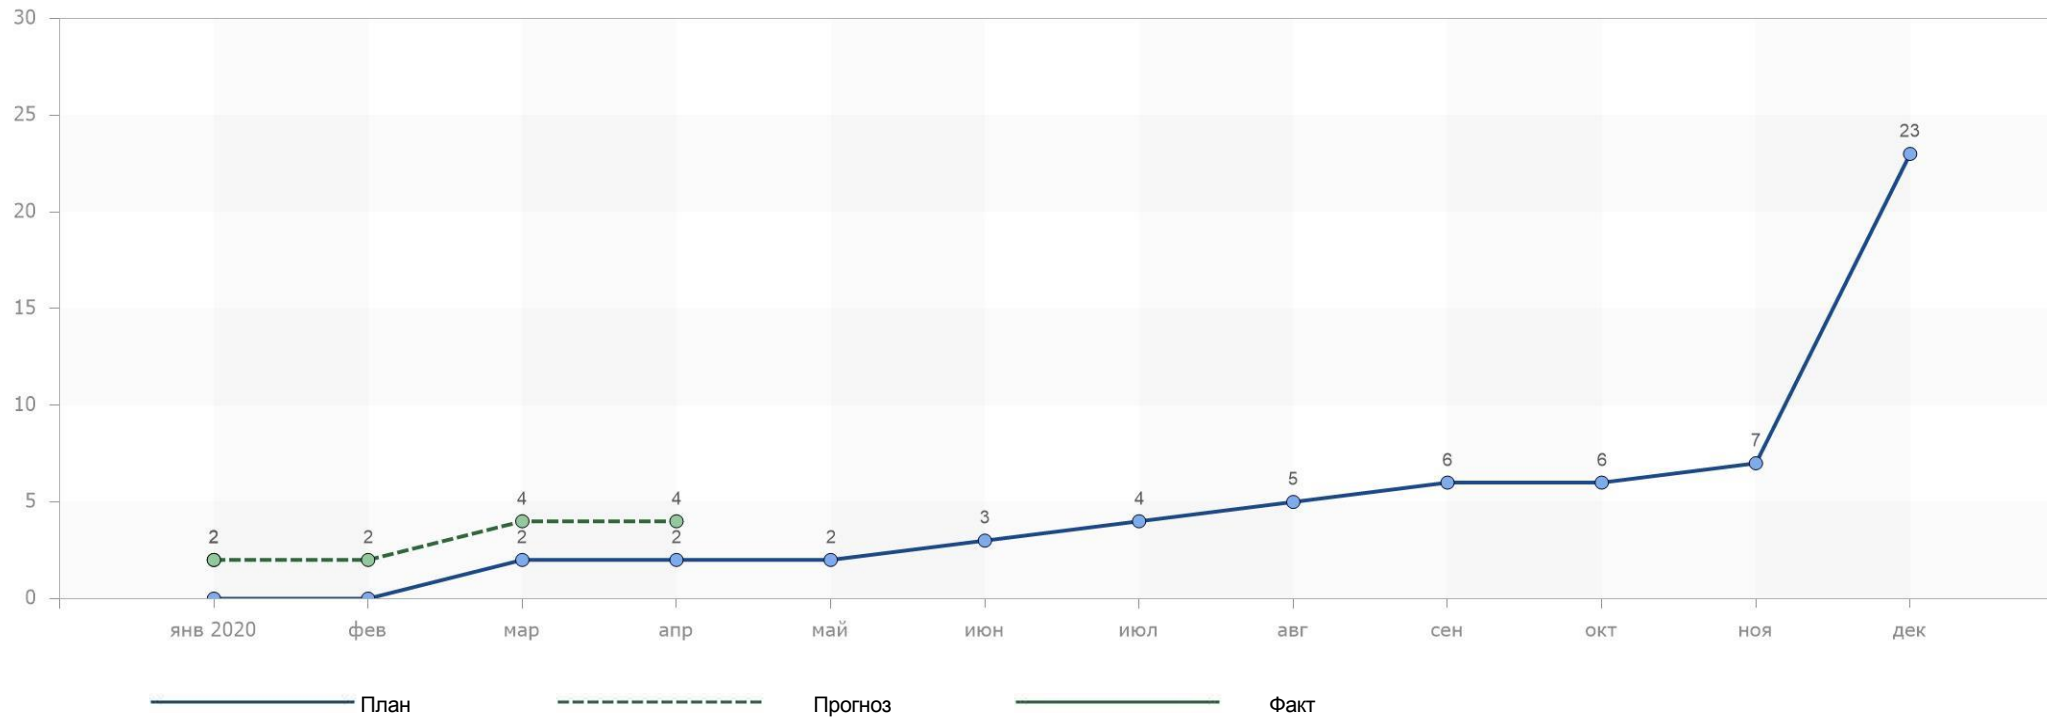


Рис. 1. "(Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 0

