


Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич



(подпись)

14.01.2020






ОДОБРЕН


ОТЧЕТ


О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА


"(E1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"


Общий статус реализации


1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
				
<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Отсутствие отклонений</i>	<i>Наличие некритических отклонений</i>	<i>Наличие некритических отклонений</i>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1.1		Доля субъектов Российской Федерации, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области "Технология" и других предметных областей, процент	ПРОЦ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Показатель достигается с 2024 года
1.2		Число общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. единиц	ТЫС ЕД	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Показатель достигается с 2020 года

1.3		Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек	ТЫС ЧЕЛ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,00	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Показатель достигается с 2020 года
1.4		Число созданных новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа, не менее тыс. мест нарастающим итогом с 2019 года	ТЫС МЕСТ	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,1200	0,1200	100,00	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
1.5		Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10% школ с худшими результатами единого государственного экзамена, раз	ПРОЦ	1,4100	0,0000	0,0000	0,0000	1,400	1,400	100,00	Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении показателя" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений



Сведения не представлены




Прогнозные сведения


3. Статус исполнения бюджета²

Бюджет субъекта
на 31 декабря 2019 года

Всего: 1 690 986,30 тыс. руб

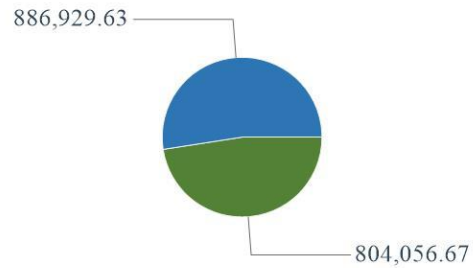


Сводный бюджет МО
на 31 декабря 2019 года
Всего: 163 219,20 тыс. руб

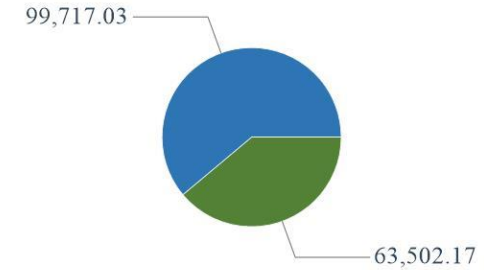

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб


Внебюджетные источники
на 31 декабря 2019 года
Всего: 0,00 тыс. руб


 Фактически исполнено


 Риски исполнения


 Остаток финансовых средств


² При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федерального проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		(03) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	304 049,70	304 049,70	304 049,70	281 774,53	81 298,29	26,74	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	304 049,70	304 049,70	304 049,70	281 774,53	81 298,29	26,74	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	273 644,70	273 644,70	273 644,70	273 644,70	73 168,46	26,74	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.3		бюджеты муниципальных образований	30 405,00	30 405,00	30 405,00	8 129,83	8 129,83	26,74	
1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		(06) 100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		(07) Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	726 515,90	726 515,90	726 515,90	726 483,72	276 861,68	38,11	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	726 515,90	726 515,90	726 515,90	726 483,72	276 861,68	38,11	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	653 874,00	653 874,00	653 874,00	653 841,82	249 175,51	38,11	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.1.3		бюджеты муниципальных образований	72 641,90	72 641,90	72 641,90	72 641,90	27 686,17	38,11	
3.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4		(16) Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	218 816,90	218 816,90	218 816,90	218 782,01	218 772,01	99,98	
4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	218 816,90	218 816,90	218 816,90	218 782,01	218 772,01	99,98	
4.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	218 816,90	218 816,90	218 816,90	218 782,01	218 772,01	99,98	
4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5		(21) Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников")	601 723,00	601 723,00	601 723,00	27 686,17	287 526,86	47,78	
5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	601 723,00	601 723,00	601 723,00	27 686,17	287 526,86	47,78	
5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	541 550,70	541 550,70	541 550,70	0,00	259 840,69	47,98	
5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.3		бюджеты муниципальных образований	60 172,30	60 172,30	60 172,30	27 686,17	27 686,17	46,01	
5.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			1 854 205,50	1 854 205,50	1 854 205,50	1 257 826,43	867 558,84	46,79	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			1 854 205,50	1 854 205,50	1 854 205,50	1 257 826,43	867 558,84	46,79	
бюджет субъекта Российской Федерации			1 690 986,30	1 690 986,30	1 690 986,30	1 149 368,53	804 056,67	47,55	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			163 219,20	163 219,20	163 219,20	108 457,90	63 502,17	38,91	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения


5. Динамика достижения контрольных точек


Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1			Обеспечена возможность изучать предметную область "Технология" и других предметных областей на базе организаций, имеющих высокооснащенные учебно-места, в т.ч. детских технопарков "Кванториум" Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: Выполнено.
1.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	15.10.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 15.10.2019г. №б/н, приложен файл.
1.1.1	РРП		Проведение мониторинга образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные учебно-места для изучения предметной области «Технология»	30.04.2019	30.04.2019	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.1.2	РРП		Проведение мониторинга образовательных организаций, в том числе, организаций культуры, спорта Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, на базе которых имеются высокооснащенные ученико-места для изучения предметных областей, включая астрономию, химию, биологию.	15.10.2019	15.10.2019	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 15.10.2019г. №б/н, приложен файл.
2			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 0, на дату 31.12.2019.	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.




 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3			Поддержка образования для детей с ограниченными возможностями здоровья. Обновление материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным основным общеобразовательным программам Значение: 1, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 1 из 1. Информация по результату: В работе.
3.1	РРП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.
3.1.1	РРП		Обеспечение организации объявления закупки товаров, работ, услуг для обновления материально-технической базы в Казенном общеобразовательном учреждении Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Березовская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2	РПП		Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	31.12.2020	08.07.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе на предоставление в 2020-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" Заявка Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2019г. №б/н, приложен файл.
3.2.1	РПП		Проведение мониторинга материально-технической базы организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам	30.04.2019	30.04.2019	Васяева О. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
3.2.2	РРП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по обновлению материально-технической базы в организациях, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программами создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	08.07.2019	08.07.2019	Васяева О. И.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "заявка на участие в отборе на предоставление в 2020-2024 годах субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" Заявка Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений




Наличие критических отклонений



Сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
4			Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "отчет о достижении результата" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений



Сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5			Обновлена материально-техническая база для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков. Создана материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах Значение: 0.041, на дату 31.12.2020	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
5.1	РПП		Закупка включена в план закупок	31.03.2020	31.03.2020	Дренин А. А.	В работе.
5.1.1	РПП		Формирование и размещение планов закупок и планов графиков закупок в единой информационной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд для создания центров "Точка роста"	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2	РРП		Участие Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей	31.12.2019	08.07.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" Заявка Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2019г. №б/н, приложен файл.
5.2.1	РРП		Мониторинг материально-технической базы общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах на предмет укомплектованности необходимым оборудованием для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей	30.04.2019	30.04.2019	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
5.2.2	РПП		Подготовка и направление заявки в Министерство просвещения Российской Федерации на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, и создание условий для реализации дистанционных программ обучения определенных категорий обучающихся, в том числе на базе сетевого партнерства	08.07.2019	08.07.2019	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации" Заявка Правительства ХМАО-Югры от 08.07.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений



Сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6			Обеспечено внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ, разработанных в рамках федерального проекта, в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Значение: 1, на дату 31.12.2022	31.12.2022	31.12.2022	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Информация по результату: В работе.
6.1	РРП		Представлен отчет о выполнении соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии на выполнение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ)	31.12.2019	30.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О приобретении учебников и учебных пособий для обучающихся" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.
6.1.1	РРП		Подготовка отчета об обеспеченности общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры учебниками и учебными пособиями для реализации общеобразовательных программ	31.12.2019	30.12.2019	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О приобретении учебников и учебных пособий для обучающихся" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.12.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7			Не менее 70% обучающихся общеобразовательных организаций вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 70 из 70. Информация по результату: В работе.
7.1	РПП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
7.1.1	РПП		Проведение мониторинга внедрения методологии наставничества обучающихся общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.
8			Не менее 70% организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме Значение: 70, на дату 31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 70 из 70. Информация по результату: В работе.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений






 Наличие критических отклонений



 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.1	РПП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	10.01.2020	Дренин А. А.	В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: мероприятие контрольной точки не выполнено в сроки, установленные в плане мероприятий регионального проекта, Причина риска: поздняя регистрация документа, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. регистрация документа 10.01.2020, срок исполнения 10.01.2020.
8.1.1	РПП		Разработка и направление в муниципальные образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры примерных соглашений (договоров) о реализации образовательных программ в сетевой форме	31.12.2019	10.01.2020	Смирнов И. В.	В работе. Просрочка 10 дней. Существует риск: Направление письма Депобразования и молодежи Югры позже срока, установленного в плане мероприятий региональным проектом, Причина риска: Поздняя регистрация документа, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 10.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Регистрация документа 10.01.2020, срок исполнения 10.01.2020.
8.2	РПП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
8.2.1	РПП		Проведение мониторинга реализации общеобразовательных программ в сетевой форме в организациях, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования	31.03.2020	31.03.2020	Смирнов И. В.	В работе.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РПП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений  Наличие отклонений  Наличие критических отклонений  Сведения не представлены  Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9			Создано не менее 1 805 новых мест в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного проекта "Современная образовательная среда для школьников") Значение: 0, на дату 31.12.2019	31.12.2019	15.01.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах позже срока, установленного в плане мероприятий регионального проекта, Причина риска: Отчетный период с 1 по 15 января 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление отчета до 15.01.2020, срок исполнения 15.01.2020. Результат достигается с 2020 года Просрочка 15 дней. Предоставлена информация : 0 из 0. Информация по результату: В работе.
9.1	РРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов*	31.12.2019	08.02.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры" Соглашение Минпросвещения России и Правительства ХМАО-Югры от 08.02.2019г. №073-09-2019-120, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений



Сведения не представлены





Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.1.1	РРП		Заключение соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях в рамках государственной программы Российской Федерации «Развитие образования»	08.02.2019	08.02.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету Ханты- Мансийского автономного округа - Югры" Соглашение Минпросвещения России и Правительства ХМАО-Югры от 08.02.2019г. №073-09-2019-120, приложен файл.
9.2	РРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	31.12.2019	15.01.2020	Дренин А. А.	В работе. Просрочка 15 дней. Существует риск: Реализация мероприятия контрольной точки позже сроков, установленных в плане мероприятий регионального проекта, Причина риска: отчетный период с 1 по 15 января 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. направление отчета до 15.01.2020, срок исполнения 15.01.2020.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.






 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.2.1	РПП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.
9.2.2	РПП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	15.10.2019	15.10.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет о расходах, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 15.10.2019г. №б/н, приложен файл.
9.2.3	РПП		Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, в целях софинансирования которых предоставлена Субсидия	31.12.2019	15.01.2020	Дренин А. А.	В работе. Просрочка 15 дней. Существует риск: Подготовка и направление в Министерство просвещения Российской Федерации отчета о расходах позже срока, установленного в плане мероприятий регионального проекта, Причина риска: Отчетный период с 1 по 15 января 2020 года, Вероятность: 10%, ожидаемая дата наступления: 15.01.2020г. Предлагаемые решения: 1. Направление отчета до 15.01.2020, срок исполнения 15.01.2020.
9.3	РПП		Предоставление субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
9.3.1	РПП		Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету	01.04.2019	01.04.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.

ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений






Наличие критических отклонений



Сведения не представлены





Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
9.3.2	РПП		Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.
9.3.3	РПП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.08.2019	31.08.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.08.2019г. №б/н, приложен файл.
9.3.4	РПП		Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
10			Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа Значение: 120, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 120 из 120. Информация по результату: Выполнено.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РПП - руководитель национального проекта.





 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.1	РРП		Предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местным бюджетам	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
10.1.1	РРП		Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету	01.04.2019	01.04.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.
10.1.2	РРП		Заключение соглашений между Депобразования и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.
10.1.3	РРП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.08.2019	31.08.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.08.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.


 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
10.1.4	РРП		Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в сельской местности и поселках городского типа	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.
11			100 % общеобразовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в которых проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся Значение: 25, на дату 30.04.2021	30.04.2021	30.04.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе. Предоставлена информация : 25 из 25. Информация по результату: В работе.
11.1	РРП		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение	31.12.2019	24.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведении межрегионального семинара" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 24.12.2019г. №1001, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет;
РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения


№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
11.1.1	РРП		Проведение межрегионального семинара "Использование результата комплексной оценки качества образовательных результатов, как механизм перехода образовательной организации в эффективный режим функционирования"	31.12.2019	24.12.2019	Смирнов И. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информация о проведении регионального семинара" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 24.12.2019г. №1001, приложен файл.
11.2	РРП		Услуга оказана (работы выполнены)	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	В работе.
11.2.1	РРП		Проведение семинара для образовательных организаций, имеющих необъективные результаты ВПР	31.03.2020	31.03.2020	Васяева О. И.	В работе.
12			Созданы новые места в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности Значение: 730, на дату 31.12.2019	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 730 из 730. Информация по результату: Выполнено.
12.1	РРП		Создано 730 новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений


 Сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
12.1.1	РРП		Формирование исходных данных для предоставления субсидии местному бюджету	01.04.2019	01.04.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.04.2019г. №б/н, приложен файл.
12.1.2	РРП		Заключение соглашений между Депобразованием и молодежи Югры и органами местного самоуправления муниципальных образований автономного округа о предоставлении субсидии местному бюджету	01.07.2019	01.07.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 01.07.2019г. №б/н, приложен файл.
12.1.3	РРП		Осуществление мониторинга мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, расположенных в городской местности	31.08.2019	31.08.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.08.2019г. №б/н, приложен файл.
12.1.4	РРП		Реализация органами местного самоуправления мероприятий по созданию новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	31.12.2019	31.12.2019	Дренин А. А.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.12.2019г. №б/н, приложен файл.


ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений

 Сведения не представлены

 Прогнозные сведения

Динамика достижения контрольных точек

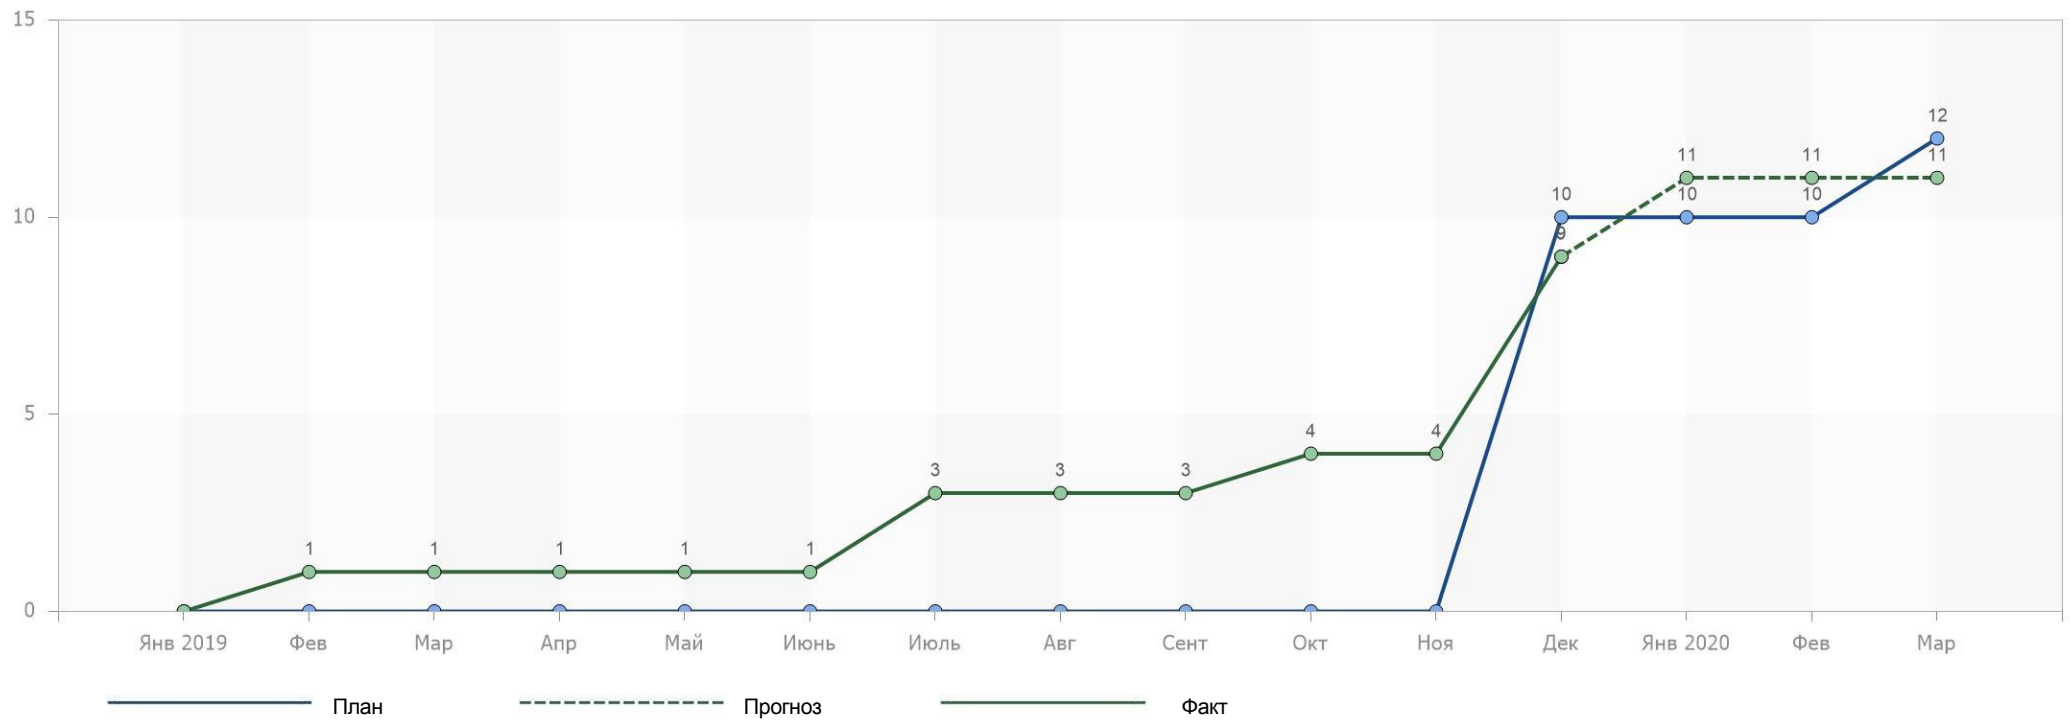


Рис. 1. "(Е1-71) Современная школа (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Просрочено контрольных точек: 0

Риски несвоевременного достижения контрольных точек: 1

