

Руководитель
регионального проекта —
Колупаев Роман Геннадьевич

(подпись)

ОДОБРЕН

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 28 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА

"(15-71) Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства "

Показатели	Результаты	Контрольные точки	Бюджет
			
--	<i>Наличие отклонений</i>	<i>Наличие отклонений</i>	92 575.000
			<i>Отсутствие отклонений</i>

1. Ключевые риски



№ п/п	Наименование показателя или результата	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
<i>Отсутствуют ключевые риски</i>				


4. Сведения о достижении результатов и контрольных точек регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.	ОЗР: Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков														
1.1.		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков в целях создания (развития) производственных и инновационных компаний (количество субъектов МСП, которые стали резидентами созданных промышленных парков, технопарков по всей территории страны, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 20.12.2021	Единица	0	4	0	4			20.12.2021	20.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отчет		Информация по значению результата: В работе. Существует риск: Нарушение срока подготовки материально-технического (кадрового) обеспечения, Причина риска: перенос сроков связан с задержкой поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с


■ Отсутствие отклонений
 ■ Наличие отклонений
 ■ Наличие критических отклонений или сведения не представлены

■ Прогнозные сведения



															мероприятий по привлечению потенциальных резидентов с целью увеличения количества резидентов, размещенных на площадях парка., срок исполнения 30.03.2021. Наличие некритических отклонений
1.2.		Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков,	Тысяча единиц	0	0.896	0	0.896			20.12.2021	20.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению В работе. Отклонения отсутствуют. Предоставлена информация : 0 из 0.896.


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги) Значение: 0,8960 Дата: 20.12.2021													
1.2.1.		Подготовлены предложения АО «Корпорация «МСП» о внесении изменений в части закрепления понятия «комплексная услуга» и наделения полномочиями АО «Корпорация «МСП» по методологической поддержке субъектов Российской Федерации, осуществляющих внедрение скоринговой модели оценки субъекта МСП, в Приказ Минэкономразвития								03.03.2021	03.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. отклонения отсутствуют

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		России об утверждении требований к реализации мероприятий, осуществляемых субъектами РФ, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства в субъектах Российской Федерации в целях достижения целей, показателей и результатов региональных проектов, обеспечивающих достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", и требований к организациям, образующим инфраструктуру													



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений



Наличие критических отклонений или сведения не представлены



Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства													
1.3.		Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес». Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Процент	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.
1.3.1.		Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)								15.03.2021	15.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют
1.4.		Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре Значение: 0,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча единиц	0	0	0	0			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 0.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

1.4.1.		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2021	01.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует		Подтверждающие документы : 1. "Информационная справка" Иное Фонд поддержки предпринимательства Югры от 01.03.2021 г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	---	-------------	--	--



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений




Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.4.2.		Разработан план мероприятий Фонда мероприятий Фонда поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес", направленный на развитие внешнеэкономической деятельности. План размещен на официальном сайте Фонда для ознакомления экспортно-ориентированных субъектов МСП								01.03.2021	01.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. Подтверждающие документы : 1. "Информационная справка" Иное Фонд поддержки предпринимательства Югры "Мой Бизнес" от 01.03.2021 г. №б/н, приложен файл. 2. "План мероприятий экспорт" Иное Фонд поддержки предпринимательства


 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



															матерельства Югры "Мой Бизнес" от 20.11.2020 г. №б/н, приложен файл. Отклонения отсутствуют
1.5.		Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО) Значение: 0,6110 Дата: 20.12.2021	Тысяча единиц	33.6	0.611	0	0.611			20.12.2021	20.12.2021	Белов Аркадий Михайлович - Генеральный директор	отсутствует		Информация по значению результата: В работе. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0.814 из 0.611.
1.6.		Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии)	Миллион рублей	112100	2910.2442	0	2910.24			20.12.2021	20.12.2021	Стручков Сергей Георгиевич -	отсутствует		Информация по значению результата:

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО) Значение: 2 910,2442 Дата: 20.12.2021										Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 11.8 из 2910.2442.
1.6.1.		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								01.03.2021	28.02.2021	Стручков Сергей Георгиевич - Генеральный директор			Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Распоряжение о директиве" Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25.12.2020г. №820-рп, приложение файл. 2. "Порядок формирования"



Отсутствие отклонений



Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения


1.7.		Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций) Значение: 0,0850 Дата: 20.12.2021	Миллиард рублей	13.4	0.085	0.0242	0.085		20.12.2021	20.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отчет	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Оборотно-сальдовая ведомость за январь - февраль 2021" Иное ООО "УК "Индустриальный парк-Югра" от 28.02.2021г. №б/н, приложен файл. Существоют риски: Обеспечить строительную готовность объектов II очереди строительства в обусловленные соглашениями сроки не представилось возможным, Причина риска: Задержка
------	--	---	-----------------	------	-------	--------	-------	--	------------	------------	--	-------	--






 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения


																									<p>поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиком антиковидными карантинными мероприятиями, активированными днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность : 50%, ожидаемая дата наступления : 20.04.2021г. Принятые меры: 1.</p>
Отсутствие отклонений		Наличие отклонений				Наличие критических отклонений или сведения не представлены								Прогнозные сведения											


																								<p>Оптимизация (запараллеливание) производства строительных-монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 25.02.2021, прогнозная дата выполнения контрольной точки 20.04.2021. Нарушение срока государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства , Причина риска: Задержка поставки металлоконструкций</p>
	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений		Наличие критических отклонений или сведения не представлены		Прогнозные сведения																	


																								<p>(поставка окончена 10.02.2021г.) , строительн ых материалов и оборудован ия в связи с проводимы ми поставщика ми антиковидн ыми карантинны ми мероприяти ями, активированн ыми днями в связи с низкой температуро й окружающе го воздуха , Вероятность : 50%, ожидаемая дата наступления : 30.04.2021г. Принятые меры: 1. Оптимизаци я (запараллел</p>
	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений				Наличие критических отклонений или сведения не представлены						Прогнозные сведения											

																									<p>ивание) производств а строительно -монтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 25.02.2021. Нарушение срока представле ния отчета использован ия финансовой поддержки на реализацию Проекта, Причина риска: Недостаточ ный объем выполненны х работ, представлен ных к софинансир ованию, Вероятность : 50%, ожидаемая дата наступления : 31.03.2021г.</p>
	Отсутствие отклонений		Наличие отклонений				Наличие критических отклонений или сведения не представлены							Прогнозные сведения											


№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
1.7.1.	[Hatched Box]	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию								01.03.2021	20.04.2021	Бардык Павел Викторович Генеральный директор			<p>В работе. Просрочка 50 дней. Существует риск: Обеспечить строительную готовность объектов II очереди строительства в обусловленные соглашением сроки не представилось возможным, Причина риска: Задержка поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидными и карантинными мероприятиями, активированным и днями в связи с низкой температурой окружающего</p>

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

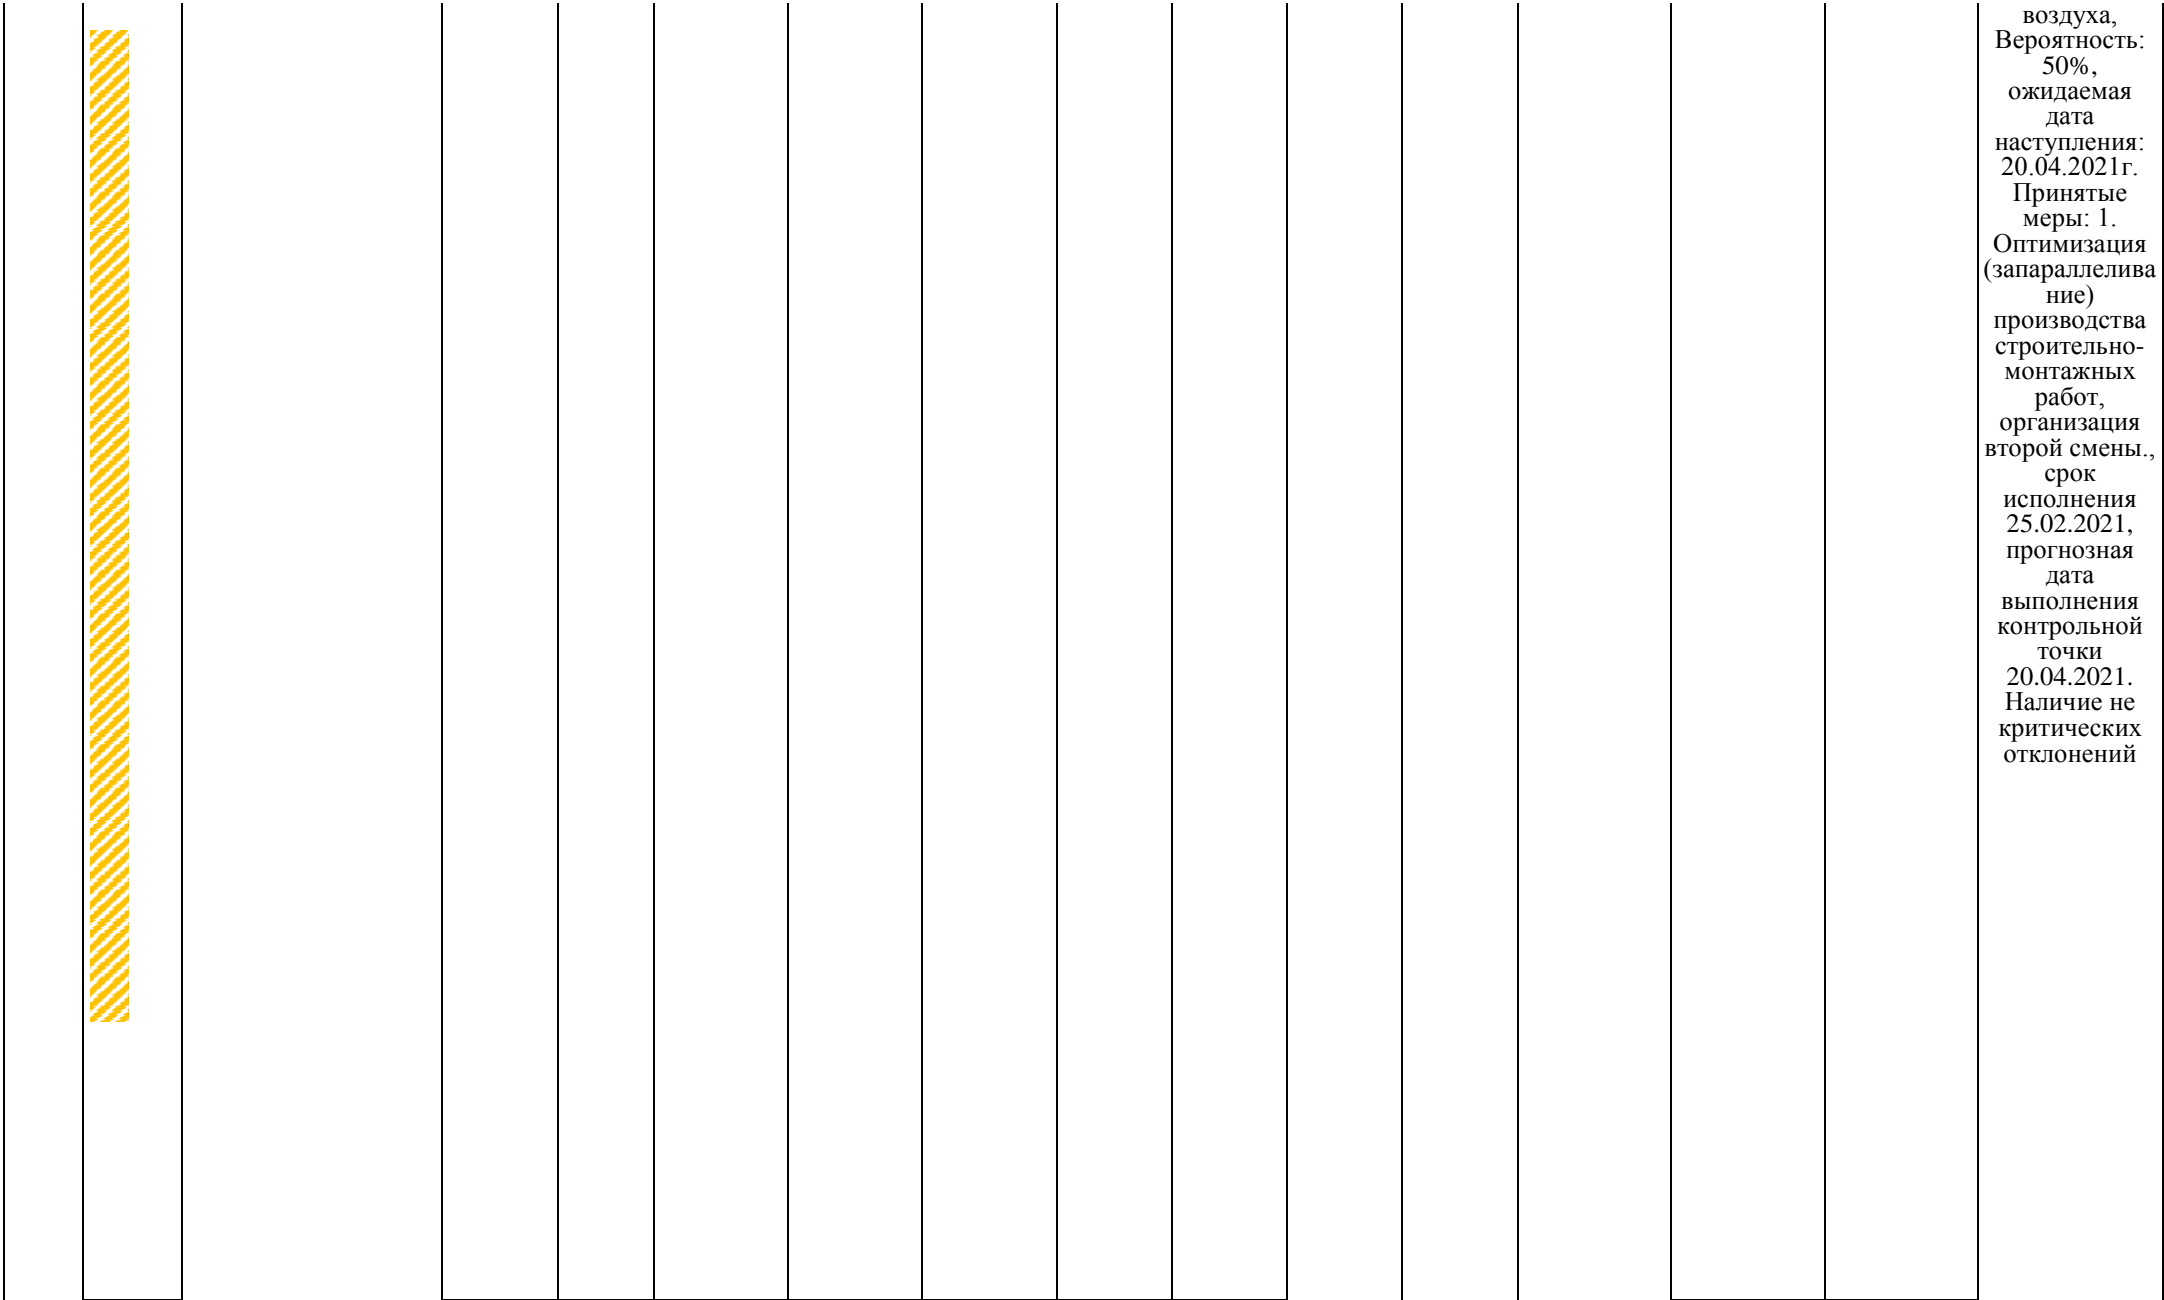


Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений или сведения не представлены

Прогнозные сведения

воздуха, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 20.04.2021г. Принятые меры: 1. Оптимизация (запараллеливание) производства строительномонтажных работ, организация второй смены., срок исполнения 25.02.2021, прогнозная дата выполнения контрольной точки 20.04.2021. Наличие не критических отклонений

1.7.2.		Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества произведена								01.04.2021	30.04.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Просрочка 29 дней. Существует риск: Нарушение срока государственной регистрации права объектов недвижимого имущества II очереди строительства, Причина риска: Задержка поставки металлоконструкций (поставка окончена 10.02.2021г.), строительных материалов и оборудования в связи с проводимыми поставщиками антиковидным и карантинными мероприятиям и, активированным и днями в связи с низкой температурой окружающего воздуха, Вероятность: 50%, ожидаемая
--------	--	---	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	--



Отсутствие отклонений




Наличие отклонений





Наличие критических отклонений или сведения не представлены





Прогнозные сведения



1.7.3.		Представлен отчет использования финансовой поддержки на реализацию Проекта								25.03.2021	31.03.2021	Бардык Павел Викторович - Генеральный директор			В работе. Просрочка 6 дней. Существует риск: Нарушение срока представления отчета использования финансовой поддержки на реализацию Проекта, Причина риска: Недостаточный объем выполненных работ, представленных к софинансированию, Вероятность: 50%, ожидаемая дата наступления: 31.03.2021г. Принятые меры: 1. Применение штрафных санкций в отношении Управляющей компании, срок исполнения 31.03.2021. Наличие некритических
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	------------	------------	--	--	--	---

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




														отклонений
1.8.		Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом) Значение: 4,0000 Дата: 31.12.2021	Единица	1561	4	0	4			31.12.2021	31.12.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	отсутствует	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация: 0 из 4
1.8.1.		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении бюджетам субъектов Российской Федерации межбюджетных трансфертов								01.03.2021	28.02.2021	Зайцев Кирилл Сергеевич - Директор Департамента промышленности Ханты-Мансийского автономного округа-Югры		Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "соглашение" Соглашение Департамента промышленности ХМАО - Югры от 29.12.2020г.

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



														№№ 082-09-2021-300, приложен файл. редакция паспорта в соответствии с ЗИ по КТ утвержден 28.01.2021 И5-39-2021/001
1.9.		Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей Значение: 2 000,0000 Дата: 31.12.2021	Тысяча рублей		2000	0	2000			31.12.2021	31.12.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор	отсутствует	Информация по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 2000.
1.9.1		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.04.2021	15.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		В работе. отклонения отсутствуют
1.9.2		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2021	31.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор		В работе. отклонения отсутствуют
1.10.		Фондом поддержки	Тысяча		4000	0	4000			31.12.20	31.12.20	Гайченцева	отсутствует	Информаци

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного года	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Количество объектов результата		Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт	план	факт/прогноз				
		предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 32,0 млн. рублей Значение: 4 000,0000 Дата: 31.12.2021	рублей							21	21	Ирина Александровна - Генеральный директор			я по значению результата: В работе. Отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 4000.
1.10.1		Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение								31.03.2021	31.03.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют
1.10.2		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)								15.04.2021	15.04.2021	Гайченцева Ирина Александровна - Генеральный директор			В работе. Отклонения отсутствуют



 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения


5. Сведения об исполнении финансового обеспечения реализации регионального проекта


№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков							
1.1		(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	
1.1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
1.1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	19 728,30	19 728,30	19 728,30	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
1.1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.1.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		(04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	42 630,00	10,66	
2.2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.4		внебюджетные источники	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	42 630,00	10,66	плановое исполнение 100%
3.3		(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантии) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки,	1 455 122,10	1 455 122,10	1 455 122,10	0,00	49 945,00	3,43	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)							
3.3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.4		внебюджетные источники	1 455 122,10	1 455 122,10	1 455 122,10	0,00	49 945,00	3,43	плановое исполнение 100%
4.4		(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	
4.4.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
4.4.1.		бюджет субъекта Российской Федерации	37 611,60	37 611,60	37 611,60	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения




№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		Федерации							плановое исполнение 100%
4.4.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5		(15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5.5.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.5.4		внебюджетные источники	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
6.6		(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	
6.6.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
6.6.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	25 416,20	25 416,20	25 416,20	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
6.6.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6.6.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7		(33) Предоставлена финансовая поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в органах местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры	78 451,10	78 451,10	78 451,10	0,00	0,00	0,00	
7.7.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	78 451,10	78 451,10	78 451,10	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7.7.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8		(34) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены


 Прогнозные сведения





№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		бизнес" предоставлена субъектам МСП компенсация части банковской процентной ставки в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в размере 16,0 млн. рублей							
8.8.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
8.8.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
8.8.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.8.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9		(35) Фондом поддержки предпринимательства Югры "Мой бизнес" предоставлена компенсация части лизинговых платежей, затрат по первоначальному взносу по договорам финансовой аренды субъектов МСП в период с 01.01.2021 по 31.12.2024 в	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения



№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		размере 32,0 млн. рублей							
9.9.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
9.9.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
9.9.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.9.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10		(36) Обеспечено оказание комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам МСП в Центре «Мой бизнес».	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	0,00	0,00	
10.10.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
10.10.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	46 349,90	46 349,90	46 349,90	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
10.10.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Федерации бюджетам муниципальных образований							
10.10.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.10.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11		(37) Обеспечен доступ субъектов МСП к экспортной поддержке в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	0,00	0,00	
11.11.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
11.11.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	22 115,70	22 115,70	22 115,70	0,00	0,00	0,00	плановое исполнение 100%
11.11.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11.1.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11.11.4		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

 Отсутствие отклонений


 Наличие отклонений


 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата и источники финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			2 175 794,90	2 175 794,90	2 175 794,90	0,00	92 575,00	0,00	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			235 672,80	235 672,80	235 672,80	0,00	0,00	0,00	
бюджет субъекта Российской Федерации			235 672,80	235 672,80	235 672,80	0,00	0,00	0,00	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
бюджеты муниципальных образований			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
внебюджетные источники			1 940 122,10	1 940 122,10	1 940 122,10	0,00	92 575,00	0,00	

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения

б. Сведения о ежемесячном исполнении федерального бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации регионального проекта в 2021 году


№ п/п	Наименование результата	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)											На конец 2021 года (тыс. рублей)
		янв	фев	март	апр	май	июн	июл	авг	сент	окт	нояб	
1	Создана комплексная система акселерации, включающая в себя финансовые и налоговые инструменты поддержки субъектов МСП, а также инфраструктуру для комфортной работы и развития субъектов МСП, доступ к закупкам крупнейших заказчиков												
1.1.	(03) Субъектам МСП, а также резидентам промышленных парков, технопарков обеспечено оказание комплексных услуг на единой площадке региональной инфраструктуры поддержки бизнеса, в том числе федеральными институтами развития (центрами компетенций), по единым требованиям к оказанию поддержки (количество субъектов МСП, получивших комплексные услуги)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	19 728,30
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	3 106,00	0,00	0,00	0,00	4 220,00	0,00	0,00	19 728,30
1.2.	(04) Субъектам МСП обеспечен льготный доступ к заемным средствам государственных микрофинансовых организаций (количество действующих микрозаймов, выданных МФО)												
	План	21 900,00	20 000,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	400 000,00
	Факт/прогноз	21 900,00	20 000,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	35 810,00	400 000,00
1.3.	(05) Субъектам МСП обеспечено предоставление поручительств (гарантий) региональными гарантийными организациями (объем финансовой поддержки, оказанной субъектам МСП, при гарантийной поддержке РГО)												
	План	0,00	0,00	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	1 455 122,10
	Факт/прогноз	0,00	0,00	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	145 512,2 1	1 455 122,10
1.4.	(06) Субъектами МСП осуществлен экспорт товаров (работ, услуг) при поддержке центров поддержки экспорта (количество субъектов МСП-экспортеров, заключивших экспортные контракты по результатам услуг ЦПЭ)												
	План	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,60	0,00	37 611,60
	Факт/прогноз	0,00	0,00	0,00	0,00	11 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 327,60	0,00	37 611,60
1.5.	(15) Увеличен объем внебюджетных инвестиций в основной капитал субъектов МСП, получивших доступ к производственным площадям и помещениям промышленных парков, технопарков (объем внебюджетных инвестиций)												
	План	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	85 000,00
	Факт/прогноз	12 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	85 000,00
1.6.	(32) Субъекты МСП в АПК получили комплексную поддержку с момента начала предпринимательской деятельности до выхода на уровень развития, предполагающий интеграцию в более крупные единицы бизнеса (количество субъектов МСП в сфере АПК, получивших поддержку, в том числе в результате услуг, оказанных центрами компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров, накопленным итогом)												


ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к методическим указаниям по мониторингу
региональных проектов


Сведения о реализации объектов результатов регионального проекта

№ п/п	Статус	Наименование результата, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода	Фактическое значение на конец отчетного периода	Прогнозное значение на конец отчетного года	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Информационная система (источник данных)	Вид и наименование документа	Комментарий
								план	факт/прогноз				
Информация по исполнению рабочих планов отсутствует													

 Отсутствие отклонений

 Наличие отклонений

 Наличие критических отклонений или сведения не представлены

 Прогнозные сведения
