Руководитель
регионального проекта —
Дренин Алексей Анатольевич

(подпись)

ОДОБРЕН

_____

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2020 ГОД

"(Е4-71) Цифровая образовательная среда (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра)"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*	*Отсутствие отклонений*

1. Ключевые риски

№ п/п	Статус	Наименование соответсвующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
Отсутствуют ключевые риски				

2. Сведения о значениях целей и показателей

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
1		Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования	Единица	0	0	0	0	1	1	100,00%	Подтверждающие документы:1. "внедрена целевая модель " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.отклонения отсутствуют
2		Доля обучающихся по программам общего образования, дополнительного образования для детей и среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе обучающихся по	Процент	5	5	5	5	100	15	666,67%	Подтверждающие документы:1. "Доля обучающихся использующих инф. сервис. платформу " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.отклонения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		указанным программам									
3		Доля образовательных организаций, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования, осуществляющих образовательную деятельность с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды, в общем числе образовательных организаций	Процент	10	10	10	10	100	15	666,67%	Подтверждающие документы:1. "Доля образовательных организаций использующих информационную сервисную платформу" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.отклонения исполнения отсутствуют
4		Доля обучающихся по программам общего образования и среднего профессионального образования, использующих федеральную информационно-сервисную платформу цифровой образовательной среды для "горизонтального" обучения и неформального образования, в общем числе обучающихся по указанным программам	Процент	0	0	0	0	100	3	3333,3%	Подтверждающие документы:1. "Доля обучающихся использующих федеральн. сервис. платформу "горизонтальное обучение"" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.отклонения исполнения отсутствуют
5		Доля педагогических работников общего образования, прошедших повышение квалификации в рамках периодической аттестации в цифровой форме с использованием информационного ресурса "одного окна" ("Современная	Процент	5.7	5.7	5.7	5.7	49.9	5	998,00%	Подтверждающие документы:1. "Доля педагогических работников прошедших повышение квалификации "одного окна"" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.отклонения исполнения отсутствуют

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
					I	II	III	IV			
		цифровая образовательная среда в Российской Федерации"), в общем числе педагогических работников общего образования									

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

3. Статус исполнения бюджета[2]

Бюджет субъекта
на 2020 год
Всего: 327 560,50 тыс. руб

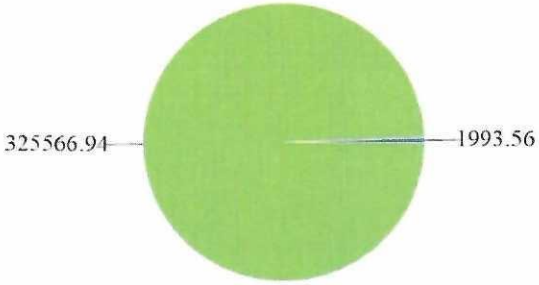

Сводный бюджет МО
на 2020 год
Всего: 14 738,78 тыс. руб

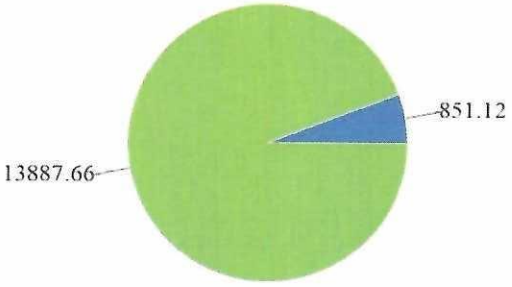

Бюджеты государственных внебюджетных фондов
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Внебюджетные источники
на 2020 год
Всего: 0,00 тыс. руб

Фактически исполнено Риски исполнения Остаток финансовых средств

[2] При построении диаграмм учитывается объем финансового обеспечения реализации федеральнго проекта (в разрезе источников финансирования), предусмотренный на текущий финансовый год.

0

Сведения об исполнении бюджета

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		*(02) В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии*	86 117,90	86 117,90	86 117,90	86 117,90	86 115,90	100,00	
1.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	86 117,90	86 117,90	86 117,90	86 117,90	86 115,90	100,00	
1.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	86 117,90	86 117,90	86 117,90	86 117,90	86 115,90	100,00	
1.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2		*(04) Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации*	228 177,70	228 177,70	228 177,70	228 177,70	227 037,26	99,50	
2.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	228 177,70	228 177,70	228 177,70	228 177,70	227 037,26	99,50	
2.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	228 177,70	228 177,70	228 177,70	228 177,70	227 037,26	99,50	
2.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2.3		бюджеты муниципальных образований	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3		*(08) Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб"*	14 738,78	14 738,78	14 738,78	0,00	13 887,66	94,23	
3.1		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	14 738,78	14 738,78	14 738,78	0,00	13 887,66	94,23	
3.1.1		бюджет субъекта Российской Федерации	13 264,90	13 264,90	13 264,90	0,00	12 413,78	93,58	
3.1.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	13 264,90	13 264,90	13 264,90	0,00	12 413,78	93,58	
3.2.3		бюджеты муниципальных образований	14 738,78	14 738,78	14 738,78	0,00	13 887,66	94,23	
3.2		внебюджетные источники	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата регионального проекта и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей			Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			329 034,38	329 034,38	329 034,38	314 295,60	327 040,82	99,39	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			329 034,38	329 034,38	329 034,38	314 295,60	327 040,82	99,39	
бюджет субъекта Российской Федерации			327 560,50	327 560,50	327 560,50	314 295,60	325 566,94	99,39	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			13 264,90	13 264,90	13 264,90	0,00	12 413,78	93,58	
бюджеты муниципальных образований			14 738,78	14 738,78	14 738,78	0,00	13 887,66	94,23	
внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

4. Статус достижения результатов

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
1		В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2024	4 1
2		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Значение: 101,0000 Дата: 31.12.2020	7
3		Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Значение: 128,0000 Дата: 31.12.2021	2
4		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Значение: 40,0000 Дата: 31.12.2020	4
5		100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети "Интернет") Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2021	1
6		Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1,0000 Дата: 31.12.2020	7 1
7		Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 7,0000 Дата: 31.12.2020	4
8		Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 14,0000 Дата: 31.12.2021	1

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Статус	Наименование результата	Достижение контрольных точек
9		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком Значение: 70,0000 Дата: 31.12.2020	6
10		100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-трафиком Значение: 75,0000 Дата: 31.12.2021	1

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

5. Динамика достижения контрольных точек

Сведения о достижении результатов, контрольных точек и мероприятий

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
1.			*В образовательных организациях, реализующих программы общего образования, дополнительного образования детей и среднего профессионального образования внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 1, на дату 31.12.2024*	31.12.2024	30.03.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.отклонения исполнения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 1.
1.1.	РРП		Обеспечено развитие государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»	30.03.2020	30.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»" Иной вид документа Депобразования и молодежи Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл. отсутствие отклонений
1.1.1	РРП		Разработка технического задания на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-	30.03.2020	30.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Югры (ГИС Образование Югры)»				автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»" Иной вид документа Депобразования от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.	РРП		Подготовлено техническое задания на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»	30.06.2020	26.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Техническое задание Депобразования и молодежи Югры от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.
1.2.1	РРП		Разработка и согласование технического задания на разработку подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»	30.06.2020	26.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Техническое задание" Техническое задание Депобразования и молодежи Югры от 26.06.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.	РРП		Обучающий семинар по использованию государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)» «Презентация новых подсистем»	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по проведению обучающего семинара " Отчет Депобраз и молодежной политки ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
1.3.1	РРП		Организация, подготовка и проведение обучающего семинара по использованию государственной информационной системы Ханты-	30.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по проведению" Отчет

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»				Департамент образования и молодежной политики ХМАО-Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
1.4.	РРП		Разработаны и введены в эксплуатацию подсистемы государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»	20.12.2020	16.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Приемка подсистемы ГИС Образование " Иное Депобразования от 16.12.2020г. №б/н, приложен файл.
1.4.1	РРП		Заседание комиссии по приему подсистем государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»	20.12.2020	16.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "приемка подсистемы ГИС Образоввание" Иное Депобразования от 16.12.2020г. №б/н, приложен файл.
1.5.	РРП		Обеспечено развитие государственной информационной системы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
1.5.1	РРП		Разработка технического задания на оказание услуг по технической поддержке и сопровождению государственной информационной системы Ханты-Мансийского	30.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			автономного округа-Югры «Цифровая образовательная платформа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (ГИС Образование Югры)»				
2.			*Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Значение: 101, на дату 31.12.2020*	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Приобретение оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. Предоставлена информация : 101 из 101.
2.1.	РРП		Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры	30.03.2020	27.02.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании инфраструктурного листа" Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.02.2020г. №10-Исх-1930, приложен файл.
2.1.1	РРП		Согласование перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры	30.03.2020	27.02.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "о согласовании инфораструктурного листа " Исходящее письмо Депобразования и молодежи Югры от 27.02.2020г. №10-Исх-1930, приложен файл.
2.2.	РРП		Произведена оценка эффективности приобретения товаров, работ, услуг	30.04.2020	03.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании инфраструктурного листа для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды"" Исходящее письмо ФГАУ "Фонд новых форм развития образования от 03.03.2020г. №1000/0303-03, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
2.2.1	РРП		Подготовка и согласование с Минпросвещением России типового проекта инфраструктурного листа технических и программных средств для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	30.04.2020	03.03.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О согласовании инфраструктурного листа для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды " Исходящее письмо ФГАУ "Фонд новых форм развития образования" от 03.03.2020г. №1000/0303-03, приложен файл.
2.3.	РРП		Конференция EDCRUNCH	30.09.2020	23.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Просрочка 54 дней. Подтверждающие документы: 1. "Конференция EDCRUNCH" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 23.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: перенос сроков проведения мероприятия , Причина риска: в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. перенос сроков проведения мероприятия на 30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020. Конференция проведена в рамках Цифровой недели
2.3.1	РРП		Организация и проведение конференции EDCRUNCH	30.09.2020	23.11.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Просрочка 54 дней. Подтверждающие документы: 1. "Конференция EDCRUNCH" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 23.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: перенос сроков проведения мероприятия , Причина риска: в связи со сложной санитарно-эпидемиологической ситуацией, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							Предлагаемые решения: 1. перенос сроков проведения мероприятия на 30.11.2020, срок исполнения 30.11.2020.
2.4.	РРП		Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях в автономном	30.10.2020	25.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов " Отчет Депобразования ХМАО от 25.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Перенос сроков проведения мероприятия, Причина риска: Отсутствие участников конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятия, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. Повторное проведение конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятия , срок исполнения 30.11.2020. Курсы повышения квалификации проведены в рамках Цифровой недели
2.4.1	РРП		Проведение курсов повышения квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций по внедрению ЦОС в общеобразовательных организациях в автономном округе	30.10.2020	25.11.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Повышение квалификации управленческих команд, сотрудников и педагогов " Отчет Депобразования ХМАО-Югры от 25.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Перенос сроков проведения мероприятия, Причина риска: Отсутствие участников конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии на проведение

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		мероприятия, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. Повторное проведение конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятия , срок исполнения 30.11.2020. курсы повышения проведены в рамках Цифровой недели
2.4.2	РРП		Размещение баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.10.2020	25.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Просрочка 26 дней. Подтверждающие документы: 1. "Размещение банера с логотипом национального проекта "Образование" в рамках Цифровой недели " Иное Депобразования ХМАО-Югры от 25.11.2020г. №б/н, приложен файл. Риск снят: Перенос сроков проведения мероприятия, Причина риска: Отсутствие участников конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятия, Вероятность: 100%, ожидаемая дата наступления: 30.11.2020г. Предлагаемые решения: 1. Повторное проведение конкурсного отбора на предоставление гранта в форме субсидии на проведение мероприятия, срок исполнения 30.11.2020. Размещение баннера на стендах в рамках Цифровой недели
2.5.	РРП		Стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты- Мансийском автономном округе-Югры	30.11.2020	24.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов " Отчет Депобразования ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №б/н, приложен файл. Стратегическая сессия проведена в рамках Цифровой

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							недели
2.5.1	РРП		Проведение стратегической сессии для руководителей муниципальных органов осуществляющих управление по развитию цифровой образовательной среды в Ханты- Мансийском автономном округе-Югры	30.11.2020	24.11.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение стратегической сессии для руководителей муниципальных органов " Отчет Депобразования ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №б/н, приложен файл. стратегическая сессия для руководителей муниципальных органов проведена в рамках Цифровой недели
2.5.2	РРП		Размещение баннеров с логотипом национального проекта и проведение информационного сопровождения в СМИ с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.11.2020	24.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Размещение банера с логотипом национального проекта" Иное Депобразования ХМАО-Югры от 24.11.2020г. №б/н, приложен файл. размещение баннеров на интерактивных площадках в рамках Цифровой недели
2.6.	РРП		Оборудование приобретено	30.11.2020	30.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на приобретение компьютерного оборудования " Иное Депобразования ХМАО-Югры от 11.08.2020г. №16-20/ЭА, приложен файл.
2.6.1	РРП		Объявление закупок товаров, работ, услуг по внедрению цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры	30.11.2020	11.08.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Контракт на поставку компьютерного оборудования " Иное Депобразования ХМАО-Югры от 11.08.2020г. №16-20/ЭА, приложен файл.
2.6.2	РРП		Размещение информационных стендов, досок с применением компонентов единого визуального стиля	30.11.2020	30.11.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Размещение информационных стендов национальный

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			национального проекта "Образование"				проект образование (приобретение оборудования)" Иное Депобразования ХМАО - Югры от 30.11.2020г. №б/н, приложен файл.
2.7.	РРП		Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного	20.12.2020	20.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Проведение мониторинга соответствия приобретенного оборудования " Иное Депобразования от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл.
2.7.1	РРП		Организован и проведен мониторинг соответствия приобретенного оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры	20.12.2020	20.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Организация и проведение мониторинга соотвествия приобретенного оборудования " Иное Депобразования от 20.12.2020г. №б/н, приложен файл.
3.			*Внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях во всех субъектах Российской Федерации Значение: 128, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 101 из 128.
			Информационная кампания о создании единой платформы государственных				
3.1.	РРП		Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
3.1.1	РРП			30.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П.	

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»				В работе. отклонения исполнения отсутствуют
3.1.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля проекта "Образование"	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
3.2.	РРП		Определение перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
3.2.1	РРП		Согласование перечня оборудования для внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях Ханты- Мансийского автономного округа-Югры	30.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
4.			*100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети*	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Образовательные организации обновили информационное наполнение сайтов сети Интернет " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 96.6 из 40.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			"Интернет") Значение: 40, на дату 31.12.2020				
4.1.	РРП		Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	30.03.2020	30.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "«Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»" Информационная справка Депобразования ХМАО-Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.
4.1.1	РРП		Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	30.03.2020	30.03.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "«Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»" Информационная справка Депобразования ХМАО-Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.
4.2.	РРП		Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	30.06.2020	30.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
4.2.1	РРП		Обновление информационного наполнения и функциональных	30.06.2020	30.06.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы:

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет.				1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
4.3.	РРП		Участие в опытной эксплуатации конструкторов сайтов федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка по обновлению и информационному наполнению сайтов" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №Б/н, приложен файл.
4.3.1	РРП		Обновление информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в соответствии с методическими рекомендациями по обновлению информационного наполнения и	30.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка обновление информационного наполнения сайтов " Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов образовательных организаций, в том числе официальных сайтов в сети Интернет.				
4.4.	РРП		Подведение итогов обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	30.12.2020	30.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обновление информационного наполнения сайтов образовательных организаций " Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют
4.4.1	РРП		Подготовка информационной справки по итогам обновления информационного наполнения и функциональных возможностей открытых и общедоступных информационных ресурсов (официальных сайтов в сети «Интернет») образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	30.12.2020	30.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Обновление информационного наполнения сайтов образовательных организаций в сети Интерент " Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
5.			*100% образовательных организаций, реализующих основные и (или) дополнительные общеобразовательные программы, обновили информационное наполнение и функциональные возможности открытых и общедоступных информационных ресурсов*	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.отклонения исполнения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 70.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			(официальных сайтов в сети "Интернет") Значение: 70, на дату 31.12.2021				
5.1.	РРП		Информационная кампания о создании единой платформы государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
5.1.1	РРП		Подготовка информационных материалов о единой платформе государственных Интернет-ресурсов «Госвеб» на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»	30.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
5.1.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля национального проекта	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
6.			*Созданы центры цифрового образования детей "IT-куб" Значение: 1, на дату 31.12.2020*	31.12.2020	30.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Подтверждающие документы: 1. "создан центр IT-куб" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
6.1.	РРП		Заключены дополнительное и финансовое соглашения по созданию и функционированию центра цифрового образования «IT-куб»	29.02.2020	18.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Депаобразования и молодежи Югры от 18.03.2020г. №71876000-1-2020-008, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
							2. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 28.08.2019г. №073-2019-Е40081-1/2, приложен файл.
6.1.1	РРП		Заключено дополнительное соглашение по реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» в автономном округе в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	29.02.2020	28.08.2019	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Дополнительное соглашение к Соглашению о реализации регионального проекта «Цифровая образовательная среда» на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 28.08.2019г. №073-2019-Е40081-1/2, приложен файл.
6.1.2	РРП		Заключено финансовое соглашение в подсистеме управления национальными проектами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет»	29.02.2020	18.03.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Просрочка 18 дней. Подтверждающие документы: 1. "Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету" Соглашение Депобразования и молодежи Югры от 18.03.2020г. №71876000-1-2020-008, приложен файл.
6.2.	РРП		Проведены процедуры по размещению извещений о проведении закупок для создания центра цифрового образования «IT-куб»	30.04.2020	30.04.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Извещение о закупке" Иной вид документа Депобразования и молодежи Югры от 30.04.2020г. №32009129718, приложен файл, указана ссылка.
6.2.1	РРП		Объявлены закупки товаров, работ,	30.04.2020	30.04.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			услуг для создания центра цифрового образования «IT-куб»				Подтверждающие документы: 1. "Извещение о закупке" Иной вид документа МАОУ ДО "Технополис" от 30.04.2020г. №32009129718, приложен файл, указана ссылка.
6.3.	РРП		Сотрудниками центра цифрового образования «IT-куб» пройдены программы повышения квалификации	30.08.2020	30.08.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразоания и молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен файл.
6.3.1	РРП		Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников центра цифрового образования «IT-куб» и педагогов	30.08.2020	30.08.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразавония и молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен файл.
6.4.	РРП		Осуществлены подготовительные мероприятия по открытию центра цифрового образования «IT-куб	30.08.2020	30.08.2020	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия" Иное Службы по контролю и надзору в сфере образования ХМАО-Югры от 06.02.2019г. №3251, приложен файл. 2. "Инормационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен файл.
6.4.1	РРП		Получена лицензия на образовательную деятельность центра цифрового образования «IT-куб» по программам дополнительного образования детей и взрослых (при необходимости)	25.08.2020	25.08.2020	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Лицензия" Иное лужбы по контролю и надзору в сфере образваония ХМАО-Югры от 06.02.2019г. №3251, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.4.2	РРП		Проведён мониторинг оснащения средствами обучения и приведения площадки центра цифрового образования «IT-куб» в соответствие с фирменным стилем	30.08.2020	30.08.2020	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен файл.
6.5.	РРП		Осуществлен набор детей, обучающихся по программа центра цифрового образования «IT-куб»	30.08.2020	30.08.2020	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен файл.
6.5.1	РРП		Завершение набора детей, обучающихся по программам центра цифрового образования «IT-куб»	30.08.2020	30.08.2020	Шувалов В. Н.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка 1 " Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 30.08.2020г. №1, приложен файл.
6.6.	РРП		Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день	06.11.2020	02.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.
6.6.1	РРП		Открытие центра цифрового образования «IT-куб» в единый день	02.11.2020	02.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
6.6.2	РРП		Размещение информационных баннеров на фасадах и иных способов брендирования с применением компонентов единого визуального стиля национальных проектов	02.11.2020	02.11.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информаицонная справка" Иное Депобразования и молодежи ХМАО-Югры от 02.11.2020г. №1, приложен файл.
6.7.	РРП		Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»	30.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	В работе. Подтверждающие документы: 1. "Информационное сопровождение деятельности IT-куб" Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют
6.7.1	РРП		Осуществлено информационное сопровождение деятельности «IT-куб»	30.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационное сопровождение деятельности IT-куб" Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл.
6.8.	РРП		Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности «IT-куб» за период с сентября по декабрь 2020 года	30.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О результатах деятельности IT - куб " Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют
6.8.1	РРП		Подготовлена аналитическая справка о результатах деятельности «IT-куб» за период с сентября по декабрь 2020 года	30.12.2020	30.12.2020	Романова Н. Ю.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "О результатах деятельности IT-куб" Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
7.			*Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 7, на дату 31.12.2020*	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Внедрение в образовательную программу современных цмфровых образовательных технологий" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 7 из 7.
7.1.	РРП		Информационное сопровождение по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	30.03.2020	30.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационная справка" Информационная справка Депобразования и молодежи Югры от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.
7.1.1	РРП		Проведение информационной компании по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	30.03.2020	30.03.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "информационная справка" Иной вид документа Депобразования от 30.03.2020г. №б/н, приложен файл.
7.2.	РРП		Утвержден перечень пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (не менее 5% от общего числа образовательных организаций), реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	30.06.2020	26.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Об утверждении пилотных образовательных организаций" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 26.06.2020г. №921, приложен файл.
7.2.1	РРП		Сформирован перечень пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-	30.06.2020	26.06.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы:

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			Югры, реализующих эксперимент по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий				1. "Об утверждении реестра пилотгых образовательных организаций" Приказ Депобразования и молодежи Югры от 26.06.2020г. №921, приложен файл.
7.3.	РРП		Обеспечение внедрения в образовательные программы пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры современных цифровых технологий	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "внедрение в образовательные программы цифровых технологий " Отчет Депобраз и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
7.3.1	РРП		Работа по внедрению образовательные программы пилотных образовательных организаций Ханты-Мансийского автономного округа-Югры современных цифровых технологий	30.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "внедрение образовательных программ пилотных образ организаций " Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
7.4.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательных организациях цифровых технологий " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
7.4.1	РРП		Проведен мониторинг реализации эксперимента по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	31.12.2020	31.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинг по внедрению в образовательных организаций цифровых образовательных технологий " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
8.			*Для не менее 35 тыс. детей, обучающихся в 25% общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, внедрены в образовательную программу современные цифровые технологии Значение: 14, на дату 31.12.2021*	31.12.2021	31.12.2021	Дренин А. А.	Информация по значению результата: В работе.отклонения исполнения отсутствуют Предоставлена информация : 0 из 14.
8.1.	РРП		Информационное сопровождение по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
8.1.1	РРП		Проведение информационной компании по внедрению в образовательную программу современных цифровых технологий	30.03.2021	30.03.2021	Горлова О. П.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
8.1.2	РРП		Проведение информационной кампании с применением компонентов единого визуального стиля проекта "Образование"	30.03.2021	30.03.2021	Цулая Л. В.	В работе. отклонения исполнения отсутствуют
9.			*100 % образовательных организаций, расположенных на территории Ханты – Мансийского автономного округа - Югры обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа,а также гарантированным интернет-*	31.12.2020	31.12.2020	Дренин А. А.	Информация по значению результата: Выполнено.Подтверждающие документы: 1. "Обеспечены Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100 Мб/с, 50 Мбс" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют Предоставлена информация : 85.6 из 70.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			трафиком Значение: 70, на дату 31.12.2020				
9.1.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.03.2020	31.03.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационно-аналитический отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 31.03.2020г. №б/н, приложен файл.
9.1.1	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	31.03.2020	31.03.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Отчет Осуществлен мониторинг обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком" Отчет Депобразования ХМАО-Югры от 31.03.2020г. №отчет, приложен файл.
9.2.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	30.06.2020	30.06.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.
			Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением				
9.2.1	РРП		со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского	30.06.2020	30.06.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Информационный отчет" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.06.2020г. №б/н, приложен файл.

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			типа, а также гарантированным интернет-трафиком				
9.3.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта	30.09.2020	30.09.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. " мониторинг обеспеченности Интернет-соединением" Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
9.3.1	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	30.09.2020	30.09.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "мониторинга обеспеченности Интернет-соединением " Отчет Депобразования и молодежи Югры от 30.09.2020г. №б/н, приложен файл.
9.4.	РРП		Обеспечен мониторинг реализации о реализации федерального проекта сформирован (в части результата федерального проекта)	31.12.2020	31.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг обеспеченности интернет соединением " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл.
9.4.1	РРП		Осуществление мониторинга обеспеченности Интернет-соединением со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского	31.12.2020	31.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Мониторинг обеспеченности Интернет-соединением " Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения исполнения отсутствуют

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений

Наличие отклонений

Наличие критических отклонений

Сведения не представлены

Прогнозные сведения

№ п/п	Уровень контроля[3]	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/прогноз		
			типа, а также гарантированным интернет-трафиком				
9.5.	РРП		Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)	31.12.2020	30.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение договоров по обеспеченнности подключения сети Интернет" Иное Депобразования от 31.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
9.5.1	РРП		Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети Интернет со скоростью соединения не менее 100Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в городах, 50Мб/с – для образовательных организаций, расположенных в сельской местности и в поселках городского типа, а также гарантированным интернет-трафиком	30.12.2020	30.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение образовательными организациями договоров по обеспеченности Интернет-соединением" Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
9.6.	РРП		Отчет Информационно-аналитический отчет Депобразования и молодежи Югры	31.12.2020	30.12.2020	Цулая Л. В.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение соглашений по оказанию услуг по предосталению доступа сети Интернет " Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен файл. отклонения отсутствуют
9.6.1	РРП		Заключение образовательными организациями Ханты-Мансийского автономного округа - Югры соглашений (договоров) об оказании услуг по предоставлению доступа к сети	30.12.2020	30.12.2020	Горлова О. П.	Выполнено. Подтверждающие документы: 1. "Заключение образовательными организациями договоров на оказание услуг по доступу сети Интернет " Иное Депобразования от 30.12.2020г. №б/н, приложен

[3]ПС - президиум Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам; ПК - проектный комитет; РНП - руководитель национального проекта.

Отсутствие отклонений | Наличие отклонений | Наличие критических отклонений | Сведения не представлены | Прогнозные сведения
